

lfd Nr.	Straße	von Hnr.	bis Hnr.	von Straße	bis Straße	Ortslage	Ortsteil	Beginn	Ende	Titel	Vorgang	Sparte
300	Jakobstraße			Paulusstraße	Löhgraben			07.02.2022	31.05.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
299	Bismarckstraße			Schlossstraße	Drimbornstraße			01.03.2022	31.12.2023	Straßenvollausbau	Geplante Maßnahme	Strassenbau
298	Turmstraße			Claßenstraße	Professor-Pirlet-Straße	und Geschwister-Scholl-Straße zwischen Schinkelstraße und Geschwister-Scholl-Straße	16	28.04.2022	31.12.2023	Brückensanierungsarbeiten Turmstraße	Einzelanordnung	Strassenbau
297	Wamichstraße			Zehnthofweg	Brühlstraße		Eilendorf	12.05.2022	30.06.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
296	Turmstraße			Professor-Pirlet-Straße	Maastrichter Straße	(Einbindung Versorgungsleitungen Maastrichter Straße)		07.06.2022	26.05.2023	Kabel- und Kanalneuverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
295	Verlautenheidener Straße	256			Heckstraße	(Zufahrt Wanderparkplatz Forsthaus Schwarzenbruch)	Haaren	29.07.2022	29.07.2023	Einrichtung einer Baustellenausfahrt	Einzelanordnung	Strassenbau
294	Verlautenheidener Straße					Bereich BAB Brücke 44	Haaren	01.08.2022	19.05.2023	Kanalneuverlegung (Pressverfahren)	Einzelanordnung	Strassenbau
293	Lousbergstraße	14						31.08.2022	30.06.2023	Absicherung eines Fasadenschadens	Einzelanordnung	Strassenbau
289	Franzstraße	1				Karmeliterstr. Aureliusstr., Franzstr., Lagerhausstr. Matthiashofstr., An den Frauenbrüdern		01.09.2022	01.12.2023	Kabelverlegungsarbeiten TKG	Geplante Maßnahme	Strassenbau
290	Lothringerstraße			Wilhelmstraße	Oppenhoffallee			01.09.2022	31.08.2023	Straßenbauarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
291	Alt-Haarener Straße	127	167			und Germanusstraße von Laachgasse bis Alt-Haarener-Straße	Haaren	01.09.2022	31.12.2023	Straßenbauarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
292	Diepenbenden	61	51			(Rückseite Haus 51)		01.09.2022	30.06.2023	Kanalrohrverlegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
288	Haarhofstraße					Von-Coels-Straße, Breitbendenstraße, Lindenstraße, Müselterweg, Schilderstraße, Nimmer Straße, Johannesstraße, Urbanstraße, Schulstraße, Betzelterstraße und Friedrich-Wilhelm-Straße	Eilendorf	19.09.2022	30.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten (TKG)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
287	Joseph-von-Görres-Straße	15						01.10.2022	16.05.2023	Absenkschacht (Kanal)	Einzelanordnung	Strassenbau
285	Zeppelinstraße	1	37			Trierer Straße Ecke Schönratherstraße, Trierer Straße bis Ecke Adenauerallee, Adenauerallee bis Ecke Thiensweg		07.10.2022	31.12.2023	Kabelverlegungsarbeiten (Telekommunikation)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
286	Eupener Straße			Il. Rote-Haag-Weg	Gut Grenzhof	Gut Grenzhof		07.10.2022	31.12.2023	Kabelverlegungsarbeiten (Telekommunikation)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
284	Soerser Weg	1	41	Krefelder Straße	Merowingerstraße			24.10.2022	12.05.2023	Versorgungsleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
283	Adalbertsteinweg	123						27.10.2022	21.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
281	Kavenstraße	11						01.11.2022	31.07.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
282	Augustinergasse	16	18			Spielplatz Augustinergasse		01.11.2022	31.12.2023	PLV Spielplatz Augustinergasse	Geplante Maßnahme	Strassenbau
280	Theaterplatz	6	16					08.11.2022	10.05.2023	Hausanschlüsse (Strom)	Einzelanordnung	Strassenbau
279	Schlottfelder Straße	4					Laurensberg	10.11.2022	16.05.2023	Notmaßnahme - Kabelfehler	Einzelanordnung	Strassenbau
278	Försterstraße					sowie Kreuzung Försterstraße/Lousbergstraße		21.11.2022	31.08.2023	Ver- und Entsorgungsleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
277	Büchel							22.11.2022	31.05.2023	Verkehrsführung Büchel anlässlich Projekt Großkölstraße	Einzelanordnung	Strassenbau
275	Wilhelmstraße	8						01.12.2022	31.12.2023	LWL Hausanschluss Telekom	Geplante Maßnahme	Strassenbau
276	Mariahilfstraße			Monheimsallee	Alexanderstraße			01.12.2022	31.12.2023	Verlegung Versorgungsleitung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
274	Altdorfstraße	26		Neustraße	Gregorstraße	Halbseitige Sperrung während Anbindungsarbeiten Gregorstraße/Altdorfstraße, Vollsperrung Neustraße 2		27.12.2022	09.06.2023	Notmaßnahme - Wasserrohrbruch (Vollsperrung)	Einzelanordnung	Strassenbau
265	Breslauer Straße			Stolberger Straße	Dresdener Straße			01.01.2023	30.06.2023	Protected Bike Lanes	Geplante Maßnahme	Strassenbau
266	Passstraße	74	92					01.01.2023	30.06.2023	Fernwärmeverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
267	Trierer Straße	778					Brand	01.01.2023	31.12.2023	Baustellen Tiefbau	Strassenbau	
268	Horbacher Straße	37	45				Richterich	01.01.2023	30.06.2023	Kabelverlegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
269	Trierer Straße	728					Brand	01.01.2023	31.12.2023	Sondernutzung allgemeiner	Strassenbau	
270	Friedrichstraße							01.01.2023	31.12.2023	Baumscheibenarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
271	Trierer Straße	769					Brand	01.01.2023	31.12.2023	Baustellen Tiefbau	Strassenbau	
272	Sophienstraße	22				bis Ecke Viktoriastraße und Viktoriastraße 56		01.01.2023	30.06.2023	Kabel- und Schutzrohrlegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
273	Reuterweg	15					Haaren	01.01.2023	31.12.2023	Netzweiterung (Net Aachen)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
264	Süsterfeldstraße	25				bis Ecke Kühlwetterstraße		06.01.2023	12.05.2023	Kanalrohrverlegung	Einzelanordnung	Strassenbau
263	Siegelallee	2a						13.01.2023	20.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
261	Achterstraße							16.01.2023	26.05.2023	Kanalbau	Einzelanordnung	Strassenbau
262	Katschhof	1						16.01.2023	30.06.2023	Fernmeldearbeiten (Glasfaser)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
260	Lindenplatz	2						19.01.2023	12.05.2023	Umgestaltungsarbeiten Spielplatz	Einzelanordnung	Strassenbau
259	Jägerstraße					1. BA HA Ecke Bendstraße bis Jägerstraße 19		20.01.2023	31.08.2023	Versorgungsleitungsverlegung	Einzelanordnung	Strassenbau
258	Würselener Wall	4	8					23.01.2023	30.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
257	Gewerbepark Brand					10 bis 57	Brand	30.01.2023	31.12.2023	Straßenendausbau 1. BA	Einzelanordnung	Strassenbau
252	Gewerbepark Brand						Brand	01.02.2023	31.12.2023	Ertüchtigung des Regenklärbeckens	Geplante Maßnahme	Strassenbau
253	Wiesenweg					Parkplatz Friedhof Horbach	Richterich	01.02.2023	30.09.2023	Ausbau von Ladeinfrastruktur	Geplante Maßnahme	Strassenbau
254	Kolpingstraße	58					Brand	01.02.2023	30.09.2023	Ausbau von Ladeinfrastruktur	Geplante Maßnahme	Strassenbau
255	Zum Blauen Stein						Laurensberg	01.02.2023	31.12.2023	PLV Pumpstation	Geplante Maßnahme	Strassenbau
256	Grünenthaler Straße	55					Richterich	01.02.2023	31.12.2023	Ausbau von Ladeinfrastruktur	Geplante Maßnahme	Strassenbau
251	Kaiserplatz	4						02.02.2023	15.05.2023	Notmaßnahme - Wasserschaden	Einzelanordnung	Strassenbau
250	Karmeliterstraße	8a						08.02.2023	20.05.2023	Notmaßnahme - Fernwärmerohrbruch	Einzelanordnung	Strassenbau
249	Judengasse	5						14.02.2023	13.05.2023	Notmaßnahme - Fernwärme	Einzelanordnung	Strassenbau
248	Burtscheider Markt					bis Dammstraße 17		17.02.2023	28.07.2023	Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
247	Bachstraße	28						21.02.2023	12.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
243	Talbothof	10	11				Laurensberg	22.02.2023	12.05.2023	Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
244	Martelenberger Weg					sowie Eckpunkte Martelenberger Weg / Luxemburger Ring und Höfchensweg / Luxemburger Ring		22.02.2023	12.05.2023	Oberflächenarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
245	Auf Überhaaren	72					Haaren	22.02.2023	16.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau

246	Blücherplatz	31						22.02.2023	16.05.2023	Notmaßnahme - Gasundichte	Einzelanordnung	Strassenbau
242	Hahner Straße	68					Korn./Walheim	23.02.2023	25.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
241	Sonnenweg					(zwischen Burg Soers und Ferberberg)	Laurensberg	27.02.2023	27.05.2023	Straßenbauarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
240	Von-Coels-Straße					Josef Straße, Suttnerstraße, etc.	Eilendorf	01.03.2023	30.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
239	Burggrafenstraße	61				(Seitlich Haus-Nr. 61 in Richtung Ecke Wiesenthal)		02.03.2023	30.06.2023	Bau- und Ladearbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
238	Sandkaulstraße	66/68						04.03.2023	14.05.2023	Notmaßnahme - Wasserrohrbruch	Einzelanordnung	Strassenbau
235	Stettiner Straße					Grünanlage Rückseite Haus 20 bis 44		06.03.2023	31.05.2023	Straßenbauarbeiten (Spielplatzgestaltung)	Einzelanordnung	Strassenbau
236	Gasborn	05. Jul				(Abschnitt Peterstraße und Promenadenstraße)		06.03.2023	02.06.2023	Rohrleitungsarbeiten (Gasundichte)	Einzelanordnung	Strassenbau
237	I. Rote-Haag-Weg	47a						06.03.2023	21.05.2023	Notmaßnahme - Kabelfehler	Einzelanordnung	Strassenbau
234	Zeppelinstraße	84						10.03.2023	18.05.2023	Notmaßnahme - Gasundichte	Einzelanordnung	Strassenbau
232	Preusweg	102						13.03.2023	21.05.2023	Notmaßnahme - Gasundichte	Einzelanordnung	Strassenbau
233	Vaalser Straße	80						13.03.2023	31.05.2023	Fassadenschaden	Einzelanordnung	Strassenbau
231	Elsassstraße	1						17.03.2023	26.05.2023	Notmaßnahme - Gasundichte	Einzelanordnung	Strassenbau
228	Henricstraße				Jupp-Müller-Straße	Kavenstraße		20.03.2023	19.05.2023	Kanalarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
229	Horbacher Straße	49				(zwischen Hausnummer 37 und 55)	Richterich	20.03.2023	12.05.2023	Versorgungsleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
230	Im Brockenfeld	1				ggü. HS. 1 / Kaiser-Friedrich-Allee, 2, 3-9, 6-14, 17 und 21-25		20.03.2023	12.05.2023	Nachpflanzung von Straßenbäumen	Einzelanordnung	Strassenbau
225	Eisenhütte							21.03.2023	12.05.2023	Lagerfläche für Material	Baustellen Tiefbau	Strassenbau
226	Kitzenhausweg	12	227				Korn./Walheim	21.03.2023	26.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
227	Schleidener Straße	400	440				Korn./Walheim	21.03.2023	27.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
224	Pontstraße				Pontdriesch	Driescher Gässchen	sowie Platz am Marienbongard	22.03.2023	30.09.2023	Erneuerung der Oberflächen, Tiefbau / Straßenbau	Einzelanordnung	Strassenbau
223	Burtscheider Straße	17						23.03.2023	31.07.2023	Verbauarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
215	Lütticher Straße	526	540					27.03.2023	31.12.2023	geplante Leitungsverlegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
216	Dammstraße	37	01. Mrz					27.03.2023	19.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
217	Waldenburger Straße	2						27.03.2023	20.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
218	Stromgasse	Nov 13	45					27.03.2023	31.08.2023	Kanalneuverlegung	Einzelanordnung	Strassenbau
219	Lemierser Straße	1	15a			und vor HS 12		27.03.2023	25.05.2023	Suchschachtungen	Einzelanordnung	Strassenbau
220	Engelbertstraße	9						27.03.2023	18.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
221	Wassily-Kandinsky-Straße	19						27.03.2023	18.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
222	Berensberger Straße	106				und Elsenborn	Richterich	27.03.2023	31.03.2024	gepl. Wasser- und Schutzrohrleitung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
212	Roermonder Straße	406						28.03.2023	09.05.2023	Notmaßnahme - Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
213	Alte Würselener Straße	15					Haaren	28.03.2023	11.05.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau
214	Lochnerstraße	29						28.03.2023	10.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
210	Gemmenicher Weg	12					Brand	29.03.2023	31.03.2024	gepl. Fernwärmerohrleitung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
211	Alkuinstraße	49	51					29.03.2023	23.05.2023	Notmaßnahme - Gasundichte	Einzelanordnung	Strassenbau
208	Krautmühlenweg	4c						30.03.2023	24.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau
209	Wendelinstraße	22					Brand	30.03.2023	10.05.2023	Notmaßnahme - Kabelfehler	Einzelanordnung	Strassenbau
189	Südstraße							01.04.2023	31.12.2023	Geplante Leitungslegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
190	Nizzaallee					Rütscher Straße, Weyhestraße, Theresienstraße, Kupferstraße, Lousberg Straße, Ludwigsallee, Roermonder Straße		01.04.2023	31.12.2023	Fernmeldearbeiten (Glasfaser - NetAachen)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
191	Burgstraße			Schmiedgasse	Dreiländerweg		Laurensberg	01.04.2023	30.06.2023	Rohrverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
192	Nizzaallee	57						01.04.2023	31.12.2023	Fernmeldearbeiten (Glasfaser)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
193	Obere Drimbornstraße	42						01.04.2023	30.06.2023	Einrichtung von Ladestationen	Geplante Maßnahme	Strassenbau
194	Jülicher Straße	317	319					01.04.2023	30.06.2023	Fernwärmeverlegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
195	Frankenberger Straße	12			Schenkendorfstraße			01.04.2023	30.09.2023	Kanalverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
196	Hans-Böckler-Allee	22	26				Laurensberg	01.04.2023	30.06.2023	Kabelverlegearbeiten - Telekommunikation	Geplante Maßnahme	Strassenbau
197	Bachstraße			Am Viadukt	Kurbrunnenstraße			01.04.2023	30.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
198	Schwarzer Weg				Prager Ring			01.04.2023	31.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
199	Grüner Weg	98	106					01.04.2023	31.12.2023	Leitungsverlegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
200	Schurzelter Straße	525					Laurensberg	01.04.2023	31.07.2023	Kabelverlegearbeiten - Telekommunikation	Geplante Maßnahme	Strassenbau
201	Bergische Gasse							01.04.2023	30.09.2023	Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen	Geplante Maßnahme	Strassenbau
202	Europaplatz					(Kreisverkehr)		01.04.2023	31.10.2023	Erneuerung der Nebenanlagen	Geplante Maßnahme	Strassenbau
203	Meersener Straße							01.04.2023	31.12.2023	Umplanung des gesamten Spielplatzes	Geplante Maßnahme	Strassenbau
204	Morillenheng	11	9					01.04.2023	31.12.2023	Fernwärmerohrleitung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
205	Im Johannistal	35				bis Ecke Pottenmühlenweg		01.04.2023	31.12.2023	Fernwärmerohrleitung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
206	Sebastianstraße	25			Krugnofen			01.04.2023	30.06.2023	Fernwärmeverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
207	Burtscheider Markt	18/20			Klosterterrasse			01.04.2023	30.06.2023	Fernwärmeverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
182	Aachener Straße	69			Oberforstbacher Straße		Korn./Walheim	03.04.2023	26.05.2023	Verlegung von Versorgungsleitungen	Einzelanordnung	Strassenbau
183	Viehhofstraße	1	29					03.04.2023	26.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
184	Gartenstraße	54						03.04.2023	12.05.2023	Kanal- und Versorgungsleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
185	Augustastraße	31b	75			und Frankenstraße 4 - 18		03.04.2023	12.05.2023	Fernmeldeleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
186	Sophienstraße	20						03.04.2023	12.05.2023	Einbau von Fahrradbügeln	Einzelanordnung	Strassenbau
187	Jülicher Straße	3	11			1, 10, Monheimsallee 2 und Hansemannplatz/Monheimsallee		03.04.2023	02.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
188	Roermonder Straße	328						03.04.2023	12.05.2023	Bordsteine austauschen	Einzelanordnung	Strassenbau
178	HANDER WEG	1					Richterich	04.04.2023	17.05.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau
179	Louis-Beißel-Straße	22						04.04.2023	10.05.2023	Notmaßnahme - Telekommunikation	Einzelanordnung	Strassenbau
180	Lochnerstraße	48						04.04.2023	31.05.2023	Fassadenschaden	Einzelanordnung	Strassenbau
181	Am Beulardstein	26					Laurensberg	04.04.2023	10.05.2023	Notmaßnahme - Telekommunikation	Einzelanordnung	Strassenbau
176	Amstelbachstraße	23					Richterich	06.04.2023	19.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau
177	Am Tivoli	19						06.04.2023	19.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau
169	Herstaler Straße	2	14					11.04.2023	10.06.2023	Fernmeldearbeiten (Glasfaser - NetAachen)	Einzelanordnung	Strassenbau
170	Behmannstraße	6	10			(Gegenüberliegend)		11.04.2023	19.05.2023	Kanalinspektionsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
171	Weststraße	21a						11.04.2023	10.05.2023	Versorgungsleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
172	Maarweg	22					Korn./Walheim	11.04.2023	01.06.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
173	Kapellenstraße			Viehhofstraße	Altdorfstraße			11.04.2023	31.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau

174	Klosterweiher						11.04.2023	31.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
175	Promenadenstraße	07. Sep					11.04.2023	11.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
167	Eilendorfer Straße	71				Brand	13.04.2023	09.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau	
168	Franzstraße	52					13.04.2023	23.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau	
165	Krefelder Straße	59					14.04.2023	18.05.2023	LWL-Montagearbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
166	Krefelder Straße	58					14.04.2023	18.05.2023	LWL-Montagearbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
159	Nizzaallee	57					17.04.2023	17.05.2023	Kabel- / Rohrverlegungsarbeiten - Glasfaser	Einzelanordnung	Strassenbau	
160	Reumontstraße	2	5a				17.04.2023	16.06.2023	Fernwärmeleitungsverlegung	Einzelanordnung	Strassenbau	
161	Europaplatz					Berliner Ring und Verlautenheidener Straße (jeweils an den Anschlussstellen)	17.04.2023	31.12.2025	Vollsperrung A544 - Neubau Haarbachtalbrücke	Einzelanordnung	Strassenbau	
162	Robensstraße	57				(gegenüber)	17.04.2023	12.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
163	Walkweg	11				Brand	17.04.2023	13.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
164	Augustastr.ä			Wilhelmstraße	Augustastr.ä		17.04.2023	14.07.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
155	Düserhofstraße	21				Laurensberg	18.04.2023	18.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation) + Reparatur Hausanschluss	Einzelanordnung	Strassenbau	
156	Martelenberger Weg	12a					18.04.2023	16.05.2023	Notmaßnahme - Gasundichte	Einzelanordnung	Strassenbau	
157	Walkweg	13				Brand	18.04.2023	13.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
158	Königstraße	51					18.04.2023	15.06.2023	Notmaßnahme - Wasserschaden (Vollsperrung)	Einzelanordnung	Strassenbau	
149	Nerscheider Weg	42				Korn./Walheim	19.04.2023	18.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau	
150	Lütticher Straße	521					19.04.2023	18.05.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau	
151	Walkweg	13				Brand	19.04.2023	15.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau	
152	Bismarckstraße	149	151				19.04.2023	23.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
153	Rolandstraße	12					19.04.2023	10.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
154	Tannenallee	17				Korn./Walheim	19.04.2023	15.05.2023	Notmaßnahme - Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau	
148	Theaterplatz	10					20.04.2023	17.05.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau	
130	Helvetierstraße					(Neben Haus 27 vor den dortigen Garagen)	Laurensberg	24.04.2023	19.05.2023	Stromleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
131	Eilendorfer Straße	98				Brand	24.04.2023	20.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau	
132	Viktoriaallee	1					24.04.2023	11.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
133	Lütticher Straße	7					24.04.2023	22.05.2023	Notmaßnahme - Gasundichte	Einzelanordnung	Strassenbau	
134	Nonnenhofstraße					Laurensberg	24.04.2023	10.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
135	Grüner Weg	29	31				24.04.2023	12.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
136	Eupener Straße	1	23				24.04.2023	02.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
137	Auf der Hörn	21					24.04.2023	12.05.2023	Erstellung Hausanschluss	Einzelanordnung	Strassenbau	
138	Roermonder Straße	292	320			Laurensberg	24.04.2023	16.06.2023	Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau	
139	Turpinstraße	110	115				24.04.2023	17.05.2023	Kanalreparaturarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
140	Schenkendorfstraße	1	3			5-15 und 17-21/23	24.04.2023	16.06.2023	Grabenlose Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
141	Karl-Marx-Allee	149	153			und 157-163	24.04.2023	17.05.2023	Grabenlose Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
142	Klara-Fey-Straße	15	25			33-41 und 47-57	24.04.2023	17.05.2023	Grabenlose Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
143	Mallinckrodtstraße	1	6			7-12 und 14-24	24.04.2023	16.06.2023	Grabenlose Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
144	Beverstraße	1	46				24.04.2023	17.05.2023	Grabenlose Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
145	Ringstraße	95				Brand	24.04.2023	19.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
146	Augustastr.ä	49	53			Eilendorf	24.04.2023	19.05.2023	Kanalreinigungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
147	Amyastr.ä	15			Eupener Straße		24.04.2023	02.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
126	Josefstraße	52				Eilendorf	25.04.2023	22.05.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau	
127	Schurzeiter Straße	464				Laurensberg	25.04.2023	16.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
128	Viktoriaallee	15					25.04.2023	16.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
129	Triebelsstraße	2					25.04.2023	19.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
117	Triebelsstraße	1					26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
118	Bismarckstraße	79					26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
119	Viktoriaallee	52					26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
120	Brabantstraße	64				und gegenüber	26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
121	Roonstraße	19					26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
122	Beverstraße	44					26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
123	Schenkendorfstraße	5					26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
124	Erzbergerallee	97	101				26.04.2023	17.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau	
125	Oppenhoffallee	14				und 41	26.04.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
116	Alt-Haarener Straße	219				rückwärtig	Haaren	27.04.2023	25.05.2023	Notmaßnahme - Gas/Wasser (Vollsperrung)	Einzelanordnung	Strassenbau
113	Preusweg	91					28.04.2023	19.05.2023	Fernmeldeleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau	
114	AUF DEM JUCH	22					Eilendorf	28.04.2023	26.05.2023	Notmaßnahme - Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau
115	Am Beulardstein	47					Laurensberg	28.04.2023	24.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
107	Bismarckstraße			Schlossstraße	Drimbornstraße			01.05.2023	31.12.2023	Kanalsanierung in geschlossener Bauweise	Geplante Maßnahme	Strassenbau
108	Alexianergraben	9				und Franzstraße bis Matthiashofstraße 51		01.05.2023	31.12.2023	Kabelverlegungsmaßnahmen TKG	Geplante Maßnahme	Strassenbau
109	Muffeter Weg	62						01.05.2023	31.12.2023	Elektroladesäule	Sondernutzung allgemein	Strassenbau
110	Welkenrather Straße	1	67					01.05.2023	31.12.2024	Ausbau Versorgungsnetz der Regionetz	Geplante Maßnahme	Strassenbau

111	Burtscheider Straße	19			Kasinostraße			01.05.2023	31.12.2023	Fernmeldearbeiten (Glasfaser - NetAachen)	Geplante Maßnahme	Strassenbau
112	Kirchfeldstraße	2	12				Eilendorf	01.05.2023	30.06.2023	Kabelverlegungsmaßnahmen	Geplante Maßnahme	Strassenbau
89	Diepenbenden	46	52					02.05.2023	04.07.2023	Grabenlose Kanalsanierung	Einzelanordnung	Strassenbau
90	Raafstraße	21					Korn./Walheim	02.05.2023	24.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
91	Stromgasse	10			bis Ecke Paugasse 20			02.05.2023	16.05.2023	Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
92	Paugasse	13	20					02.05.2023	16.05.2023	Kanal Reparaturarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
93	Kapuzinergraben	6	16		Kapuzinergraben 19a-e; Kapuzinergraben 24-32			02.05.2023	16.06.2023	Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
94	Friedrich-Wilhelm-Platz				Ecke Wirichsbongardstraße			02.05.2023	09.05.2023	Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
95	Friedrich-Wilhelm-Platz	11	13					02.05.2023	09.05.2023	Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
96	Kurfürstenstraße							02.05.2023	31.12.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
97	Schloss-Rahe-Straße	21a					Laurensberg	02.05.2023	28.05.2023	Suchschachtungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
98	Am Neuenhof	39						02.05.2023	01.06.2023	Versorgungsleitungsarbeiten (Gas/Wasser)	Einzelanordnung	Strassenbau
99	Ronheider Berg	256						02.05.2023	17.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
100	Heckstraße	50					Eilendorf	02.05.2023	12.05.2023	Einbau von Fahrradbügeln	Einzelanordnung	Strassenbau
101	Beverstraße	44					Eilendorf	02.05.2023	12.05.2023	Einbau von Fahrradbügeln	Einzelanordnung	Strassenbau
102	Adalbertsteinweg	176			184 und 186			02.05.2023	12.05.2023	Einbau von Fahrradbügeln	Einzelanordnung	Strassenbau
103	Eckenberger Straße	15						02.05.2023	12.05.2023	Arbeiten mit Autokran/Arbeitsbühne	Einzelanordnung	Strassenbau
104	Haarbachtalstraße	2			14 und Ecke Akazienstraße	Haaren		02.05.2023	23.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
105	Elsasstraße	7			21-23, 30, 36, 42 und 26			02.05.2023	12.05.2023	Einbau von Fahrradbügeln	Einzelanordnung	Strassenbau
106	Breslauer Straße				Dresdener Straße			02.05.2023	31.08.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
86	Geschwister-Scholl-Straße	20						03.05.2023	26.05.2023	Kanalneuerlegung	Einzelanordnung	Strassenbau
87	Florastraße	2					Korn./Walheim	03.05.2023	30.05.2023	Notmaßnahme - Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau
88	Membachweg	17					Brand	03.05.2023	30.05.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau
82	Prager Ring	100						04.05.2023	02.06.2023	Hausanschlussarbeiten (Fernwärme)	Einzelanordnung	Strassenbau
83	Im Vennbahnbogen	13					Korn./Walheim	04.05.2023	24.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau
84	Prager Ring	108						04.05.2023	02.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
85	Büchel	51						04.05.2023	24.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau
79	Johannesstraße	9					Eilendorf	05.05.2023	31.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
80	Johannesstraße	19					Eilendorf	05.05.2023	30.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
81	Kackertstraße	10					Laurensberg	05.05.2023	31.05.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
78	Rathausstraße	31					Laurensberg	06.05.2023	06.06.2023	Versorgungsleitungsarbeiten (Gas/Wasser)	Einzelanordnung	Strassenbau
69	Kahlgrachtstraße	3a			(gegenüber 10)	Haaren		08.05.2023	26.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
70	LANDGRABEN	47					Laurensberg	08.05.2023	05.06.2023	Notmaßnahme - Gas	Einzelanordnung	Strassenbau
71	Lindenstraße	1					Eilendorf	08.05.2023	29.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
72	Kavenstraße	7	9		Kavenstraße 11 - Henricstraße 34 sowie Scherbstraße 4a und 8			08.05.2023	26.05.2023	Glasfaserausbau	Einzelanordnung	Strassenbau
73	Horbacher Straße	330					Richterich	08.05.2023	24.06.2023	grabenlose Kanalsanierung	Einzelanordnung	Strassenbau
74	Amsterdamer Ring				Vaalsener Straße			08.05.2023	31.05.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau
75	Oberforstbacher Straße	357					Korn./Walheim	08.05.2023	04.06.2023	Notmaßnahme - Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
76	Pottenmühlenweg	22						08.05.2023	03.06.2023	Notmaßnahme - Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau
77	Theaterplatz	16						08.05.2023	03.06.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau
61	Gemmenicher Weg	12					Brand	09.05.2023	09.05.2023	Erkundungsbohrungen	Einzelanordnung	Strassenbau
62	AUF DER HÜLS	144			Ecke Charlottenburger Allee			09.05.2023	29.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau
63	Veltmanplatz	18						09.05.2023	31.07.2023	Fassadenschaden	Einzelanordnung	Strassenbau
64	Zum Blauen Stein	22					Laurensberg	09.05.2023	02.06.2023	Notmaßnahme - Wasserschaden	Einzelanordnung	Strassenbau
65	Hitfelder Straße	73						09.05.2023	02.06.2023	Notmaßnahme - Strom	Einzelanordnung	Strassenbau
66	Severinstraße	128					Eilendorf	09.05.2023	12.05.2023	Notmaßnahme - Kanalreparatur	Einzelanordnung	Strassenbau
67	Kornelimünsterweg	20						09.05.2023	26.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau
68	Fuchserde	20a						09.05.2023	26.05.2023	Notmaßnahme - Störungsbeseitigung (Telekommunikation)	Einzelanordnung	Strassenbau
52	Drosselweg	76			Engelbertstraße 7			10.05.2023	10.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
53	Raerener Straße	201			Im Langfeld 4		Korn./Walheim	10.05.2023	10.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
54	Roermonder Straße	540					Laurensberg	10.05.2023	09.06.2023	Versorgungsleitungsarbeiten (Gas/Wasser)	Einzelanordnung	Strassenbau
55	Triftweg	57			Raerener Straße		Korn./Walheim	10.05.2023	10.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
56	Raerener Straße	315			Triftweg		Korn./Walheim	10.05.2023	10.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
57	Monschauer Straße	208	224				Korn./Walheim	10.05.2023	10.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
58	Neustraße	25	37		, Sebastianstraße 11 - 35 und Krugenofer 47 - 65			10.05.2023	30.06.2023	Kabelverlegearbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
59	Baumgartsweg	42	106				Korn./Walheim	10.05.2023	10.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
60	Kruppstraße	39	41					10.05.2023	31.05.2023	Nacharbeiten Oberfläche	Einzelanordnung	Strassenbau
48	Parkstraße	46					Richterich	11.05.2023	10.06.2023	Versorgungsleitungsarbeiten (Gas/Wasser)	Einzelanordnung	Strassenbau
49	Forster Weg	29						11.05.2023	21.05.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
50	Am Tunnel						Eilendorf	11.05.2023	31.10.2023	Rohrverlegungsarbeiten (Erneuerung Durchlass Haarbach)	Einzelanordnung	Strassenbau
51	Steinkaulstraße	2	4					11.05.2023	11.05.2023	Reparaturarbeiten am Staukanal	Einzelanordnung	Strassenbau
47	Schmithofer Straße	56					Korn./Walheim	12.05.2023	07.06.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
36	Hainbuchenstraße	4	10					15.05.2023	14.06.2023	Versorgungsleitungsarbeiten (Gas/Wasser/Strom)	Einzelanordnung	Strassenbau
37	Dellstraße	20					Richterich	15.05.2023	12.06.2023	Verlegungsarbeiten (Gas/Wasser)	Einzelanordnung	Strassenbau
38	Altenberger Straße	4	9					15.05.2023	02.06.2023	Fernmeldearbeiten (Glasfaser - NetAachen)	Einzelanordnung	Strassenbau
39	Ottostraße	33	35					15.05.2023	26.05.2023	Nachpflanzung von Straßenbäumen	Einzelanordnung	Strassenbau
40	Ronheider Berg	231						15.05.2023	07.07.2023	Versorgungsleitungsarbeiten (Gas/Wasser)	Einzelanordnung	Strassenbau
41	Eilfschornsteinstraße	20			gegenüber			15.05.2023	26.05.2023	Nachpflanzung von Straßenbäumen	Einzelanordnung	Strassenbau

42	Annuntiatenbach	27				Kasinostraße 34; Bendstraße 33		15.05.2023	26.05.2023	Einbau von Fahrradbügeln	Einzelanordnung	Strassenbau
43	Lothringerstraße	1						15.05.2023	17.05.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
44	Pontwall	8				Wüllnerstraße 9		15.05.2023	15.06.2023	Verlegungsarbeiten Gas/Wasser	Einzelanordnung	Strassenbau
45	Hirschgraben	10						15.05.2023	09.06.2023	Arbeiten an Fernmeldeleitungen	Einzelanordnung	Strassenbau
46	Friesenrather Weg	104					Korn./Walheim	15.05.2023	09.06.2023	Hausanschlussarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
33	Adalbertstraße	1						16.05.2023	19.05.2023	Schachtsanierung	Einzelanordnung	Strassenbau
34	Alexianergraben	45						16.05.2023	31.05.2023	Kanalreparaturarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
35	Friedrich-Wilhelm-Platz	14						16.05.2023	19.05.2023	Schachtsanierung	Einzelanordnung	Strassenbau
32	Mauerstraße							17.05.2023	16.06.2023	Fernmeldeleitungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
27	Bilstermühler Straße	1			Napoleonsberg		Korn./Walheim	22.05.2023	31.05.2023	Kanalreparaturarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
28	Talstraße	23						22.05.2023	04.06.2023	Grabenlose Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
29	Jakobstraße	120				96 bis 100/102. 78 bis 80 und Paulusstraße 6/8		22.05.2023	31.07.2023	Kanalsanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise	Einzelanordnung	Strassenbau
30	Promenadenstraße	07. Sep						22.05.2023	23.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
31	Weberstraße	1	19			(zwischen Boxgraben und Brücke)		22.05.2023	31.12.2023	Versorgungsleitungsarbeiten (Kanalneuerlegung, Gas/Wasser/Strom)	Einzelanordnung	Strassenbau
26	Bachstraße	22						26.05.2023	04.06.2023	grabenlose Kanalsanierungsarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
12	Ambrosiusstraße	32	27					01.06.2023	31.08.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
13	Kapellenstraße			Viehhofstraße	Malmedyer Straße			01.06.2023	31.12.2023	Straßenbauarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
14	Monschauer Straße	40					Korn./Walheim	01.06.2023	31.07.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
15	Urbanstraße	37			Johannesstraße			01.06.2023	31.12.2023	Straßenbauarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
16	Debyestraße	111				und 169	Eilendorf	01.06.2023	31.07.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
17	Eginhardstraße							01.06.2023	31.12.2023	Straßenbauarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
18	Am Römerhof			Am Römerhof	Branderhofer Weg			01.06.2023	31.12.2023	Straßenneubau	Geplante Maßnahme	Strassenbau
19	Pontstraße	2	38					01.06.2023	31.12.2024	geplante Maßnahme Erneuerung Versorgungs- und Entsorgungsleitungen	Geplante Maßnahme	Strassenbau
20	Pontstraße	40	55					01.06.2023	31.12.2024	geplante Maßnahme Erneuerung Versorgungsleitungen	Geplante Maßnahme	Strassenbau
21	Herbartstraße					Stichwege Fichtestraße und Herbartstraße		01.06.2023	31.12.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
22	Bergdriesch	38						01.06.2023	31.12.2024	geplante Leitungslegung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
23	Borchersstraße							01.06.2023	31.12.2024	geplanter Ausbau des Entsorgungsnetzes	Geplante Maßnahme	Strassenbau
24	Prager Ring	100				(gegenüberliegend)		01.06.2023	31.12.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
25	Charlottenburger Allee	39			Schönebergstraße 5			01.06.2023	30.06.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
11	Strüverweg					(an der Ecke Ferberberg und Schlossparkstraße)	Laurensberg	22.06.2023	30.06.2023	Straßenbauarbeiten	Einzelanordnung	Strassenbau
2	Stadtgebiet Aachen							01.07.2023	31.12.2024	Rad-Vorrang-Route Aachen (Mitte)- Haaren- Verlautenheide	Geplante Maßnahme	Strassenbau
3	Stadtspark							01.07.2023	30.06.2024	Erneuerungen von Grünanlagen und Wege- /Platzflächen, Baumpflanzung	Geplante Maßnahme	Strassenbau
4	Försterstraße							01.07.2023	30.06.2024	Umgestaltung Straßenoberfläche	Geplante Maßnahme	Strassenbau
5	Hergelsbendenstraße	10			Benno-Levy-Weg	und Hergelsmühlenweg	Haaren	01.07.2023	31.12.2023	Kabelverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
6	Aachener-und-Münchener-Allee							01.07.2023	31.12.2023	Ver- und Entsorgungsleitungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
7	LINTERTSTRASSE			Adenauerallee	Fichtestraße			01.07.2023	30.06.2024	Radvorrangroute	Geplante Maßnahme	Strassenbau
8	Trierer Straße	194			Adenauerallee			01.07.2023	31.12.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
9	Flandrische Straße			Siegelallee	Louis-Beißel-Straße			01.07.2023	31.12.2023	Leitungsverlegungsarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
10	Raerener Straße	49	43				Korn./Walheim	01.07.2023	31.12.2023	Straßenbauarbeiten	Geplante Maßnahme	Strassenbau
1	Horbacher Straße	43	45a				Richterich	01.08.2023	30.06.2024	LWL Hausanschlussarbeiten Vodafone	Geplante Maßnahme	Strassenbau

Fortgang von Planungs-/Baumaßnahmen (Stand 10.05.2023)

Bezeichnung	Tätigkeit	Bereich	Status	Planungsbeschlüsse		Ausführungsbeschlüsse		Ausführung		Bemerkung
				Bez. V. Quartal, Monat/Jahr	MoA Quartal, Monat/Jahr	Bez. V. Quartal, Monat/Jahr	MoA Quartal, Monat/Jahr	Beginn Quartal, Monat/Jahr	Abschluss Quartal, Monat/Jahr	
Adenauerallee	Interimsfeuerwehrwache	Zufahrt	Planung	n. benötigt	n. benötigt	n. benötigt	n. benötigt	Q4/2023	Q4/2023	von E26 und FB 37 initiiert in Mittelbereitstellung, Planung und Bau der Zufahrten in öffentlichen Bereich durch 700
Albert-Einstein-Str., 2. BA	Umbau + Erneuerung, 2. BA Kreisverkehr		Planung					2024/2025		
An den Birkenweiden (In den Zwanzigmorgen bis Am Branderhof)	Erneuerung Fahrbahn, ggf. Nebenanlagen		Planung					2024		
Auf der Kler	Entwässerung, schlechter Straßenzustand		Planung					2024		
Barrierefreier Ausbau im Straßenraum	Standards erarbeiten		Planung					laufend		
Bechheim	Wiederherstellung Landwirtschaftlicher Weg und Bach nach Hochwasser		Vorplanung					2024		
Beleuchtung 2023			Planung					laufend		
Bismarckstraße	RVR Brand, Fahrradstraße		Planung	03.02.2021	18.02.2021			2023		
B-Plan Branderhof	Erschließung Wohngebiet		Planung					2024		
B-Plan Haaren Ortsmitte	Erschließung Wohngebiet	Gesamt	Planung				mit Satungsbeschluss Q3/2022			
B-Plan Karl-Kuck-Straße	Erschließung Wohngebiet		Planung					2024		
B-Plan Rathausstraße	Geh-/Radwegverbindung		Planung							
B-Plan Richterlicher Dell	Masterplan		Planung							
B-Plan Roermonder Straße/ Rütcher Straße	Geh-/Radwegverbindung		Planung							
B-Plan Sonnenscheinstraße	Erschließung Kleingartenanlage		Planung					2024		
Breslauer Straße	Einrichtung RVA auf Fahrbahn	Stolberger Straße bis Dresdener Straße	Planung	10/2021	11/2021	10/2021	11/2021	2023	2023	Planungs- und Ausführungsbeschluss in einem, Untersuchung Straßenabläufe läuft noch, dann erst weiteres Vorgehen planbar
Breslauer Straße	Einrichtung RVA auf Fahrbahn	Dresdener Straße bis Berliner Ring	Vorplanung							Programmierberatung Q1/2024
Burggrafenstraße	Erschließung Wohngebiet		Planung					2024		
Burghöhenweg	Erschließung Wohngebiet (Grundstücktausch)		Vergabe					2024		
Burtscheider Straße	Überplanung Nebenanlagen		Vorplanung							
Campus West Erschließung	Erschließung Forschungscluster		Planung					2025ff		
Campus West, Nordanbindung	Erschließung Forschungscluster		Planung					2026		
Charlottenburger Allee	Ausbau Trampelpfad zu Geh-/Radweg, Umleitungsstrecke Brückenabriss A544		Planung					2023/2024		
Driescher Gässchen / Templergarten	Einseitige Fahrradstraße (Fahrtrichtung Hauptgebäude), Mittelrinnung herstellen		Planung		12.01.2022	über Verkehrsordnung		2023		
Eginhardstraße	Erneuerung Fahrbahn & Nebenanlagen nach Regionetz	Gesamt	Planung	06/2017	-	Q3/4 2023	Q3/4 2023	2024	2024	
Europaplatz	Erneuerung Nebenanlagen	Gesamt	Planung	06/2021 & Klima/Umwelt	07/2021			2023	2023	
Fahrradabstellanlagen	diverse									
Flandrische Str von Siegelallee bis Louis-Beißel-Str	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen		Planung					2024		
Försterstraße	Erneuerung nach Regionetz, Fahrbahn und Nebenanlagen	Gesamt	Vorlage i. Umlauf			24.05.2023	07.06.2023	Q3/2023	Q2/2024	gesch. Bauzeit 8 Monate lt. Vorlage
Freunder Landstraße	Neuaufteilung der Verkehrsflächen	Gesamt	Vorplanung							Programmierberatung Q1/2024
Geschwister-Scholl-Straße	Endausbau, inkl. Parkstände und Baumscheiben	Gesamt	Planung					2023		
Gewerbepark Brand		Gesamt	Bau					2023		
Goffartstraße	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlage	Gesamt	Planung					2025	2025	Planungs- und Ausführungsbeschluss wird gleichzeitig gefasst werden
Gringelsbach	Erschließung, Endausbau von B-Plan (25 Jahre Baustraße)		Planung					2024		
Grüner Weg	Erneuerung nach Regionetz, Fahrbahn + Nebenanlage	Lombardenstraße bis Prager Ring	Vorplanung	Q3/2023	Q3/2023	Q1/2024	Q1/2024	2024		
Guler Hirte, Erschließung (B-Plan 963)	Betreuung Endausbau des Investors in 2021- 2023		Planung					2026		
Hallestellen Barrierefreier Ausbau	Barrierefreier Ausbau, Fördermittel		laufend					laufend		
Hallestellen Barrierefreier Ausbau kompakt	Barrierefreier Ausbau von 60 Hallestellen / a		Planung					2023		
Hohenstaufenallee 1. BA Tunnel bis Lütticher Straße	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlagen		Planung					2025		
Hubert Spickernagel Straße	Ertüchtigung Landwirtschaftlicher Weg für den Radverkehr		Vorplanung					2024		
ISEK Haaren	Tuchmacherweg, Platz an der Friedensstr., Platz am Kloster, Ortseingang Jülicher Str.		Planung					2024		
Jakobstraße	Erneuerung nach Regionetz; Fahrbahn + Nebenanlage Premiumweg Nr. 7	Judengasse bis Karlsgraben	Vergabe	11/2016	11/2016 & PLA	03/2022	03/2022	2023	2024	geschätzte Bauzeit 6-7 Monate
Jülicher Straße - Busspur	Sanierung Busspur von Hallestelle Blücherplatz bis Hansemannplatz	von Hallestelle Blücherplatz bis Hansemannplatz	Vergabe			17.08.2022	17.08.2022/01.09.2022	Q3/2023		Vergabe Vorplanung
Jülicher Straße	Umgestaltung	Blücherplatz - Ortseingang Haaren						2024		
Kapellenplatz	Markplatzumbau inkl. Wasserlauf		Planung							
Karl-Friedrich Straße	Erneuerung und Umgestaltung		Vorplanung							Q2/2024 Programmberatung
Kaubendenstraße	Stichstraße Endausbau		Planung					2024		
Kelmesbergweg	B-Plan Investorenbebauung		Bau					2023/2024		
Ketteler Straße, Don Bosco Straße	Erneuerung		Planung	Q3/23	Q3/23					
Klappergasse / Rennbahn	Platzgestaltung und Bachöfenanlage		Vorplanung					2024		
Krakastraße	Umgestaltung nach Regionetz	Gesamt	Vorplanung							Juni 23 Bürgerbeteiligung zur Planung
Krefelder Straße (Normannenstr. - Soerser Weg)	Unfallschwerpunkt - Radverkehrsanlage/Sicherheitsstreifen erforderlich		Vorplanung					2023		
Krefelder Straße (Soerser Weg bis Bastei)	Radverkehrsanlage PBL		Bau					2023		
Krefelder Straße Bastei	Knoten, KKS Maßnahme, Umsetzung nach Radentscheid Aachen		Planung					2024		
Krefelderstraße	Radverkehrsanlage/Sicherheitsstreifen (Maßnahme nach UK)	Normannenstr. bis Soerser Weg	Planung							
Krefelderstraße	PBL	Soerser Weg bis Bastei	Ausführung		19.05.2022			Q2/2023		
Kullenhofstraße	Umbau Überquerungsstelle (im Zusammenhang mit dem Städtebaulichen Vertrag)		Planung					2024		

Kurfürstenstraße	Erneuerung Fahrbahn + Nebenanlagen mit neuen Baumfeldern	Gesamt	Planung	vsl. 06/2023	vsl. 08/2023	vsl. 06/2023	vsl. 08/2023	2024	2024	Regionetz baut ab 05/2023 für 10 Monate; Planungs- (Baumstandorte) und Ausführungsbeschluss (Erneuerung) in einem
Lichtenbusch Erschließung 2. BA	Endausbau		Planung					2024		
Lintertstraße	RVR Brand	überwiegend Nebenanlagen	Planung	22.09.2021	30.09.2021	11.01.2023	12.01.2023	Q3/2023	2024	geschätzte Bauzeit ca. 8 Monate
Lothringerstr. zw. Wilhelmstraße und Oppenhofallee, 2. BA	2. BA Umbau Platz, einseitige Anpassung Nebenanlagen, Markierung Fahrradstraße	zw. Wilhelmstr. Und Oppenhofallee	vor Ausschreibung	Jan 2021		16.11.2022	01.12.2022	Q3/2023		Bauzeit noch nicht abschätzbar
Louis-Beißel-Str. von Siegelallee bis 1.-Rote-Haag-Weg	Erneuerung Fahrbahn + Nebenanlagen		Planung					2024		
Ludwigsallee (1.BA)	Neumarkierung	Lousberg - Roermonderstraße	Planung	Q2/2023	Q2/2023					
Lütticher Str.	2.BA	Limburger Straße - Amsterdamer Ring	Planung			Q2/2024				
Lütticher Str.	Markierung 3.BA		Vorplanung	Jan 2023			Jan 2023			
Metzgerstraße (Feldstraße bis Ende)	Erneuerung Fahrbahn + Nebenanlagen nach Regionetz		Planung					2024		
Monheimsallee/Heinrichsallee	Radverkehrsanlage PBL		in Ausschreibung	27.10.2021	11.11.2021	27.10.2021	11.11.2021	2023	2023	4-5 Wochen Bauzeit, da Ausschreibung bisher erfolglos, Umsetzungszeitpunkt noch in Klärung
Münster Straße	Nebenanlagen		Planung							
NBK 2022			Bau							
Nizzaallee	Querungshilfe		Planung					2023		
Nordstraße Brand	Anpassungen, Zusatz zum Gewerbepark		Planung					2024		
Pontstraße	Erneuerung nach Regionetz, Fahrbahn und Nebenanlagen	Kreuzherrenstr bis Pontwall	Vorplanung							Q1/2024 Programmberatung
Pontstraße 1. BA	Erneuerung nach Regionetz, Fahrbahn und Nebenanlagen	Templergraben bis Kreuzherrenstr	laufend	06.01.2020	30.01.2020	19.10.2022	27.10.2022	Q1/2023	Q3/2023	geschätzte Bauzeit 4-5 Monate
Pontstraße 4. BA	zum Markt	Markt bis Augustinerbach	vor Baubeginn					Q2/2023	Q4/2023	geschätzte Bauzeit 7 Monate
Pontwall	Überplanung gem pol. Beschluss		Vorplanung							Q4/2023 Programmberatung
Radschnellweg	Neuplanung	Grabenring bis Stadtgrenze Richterich	Vorplanung							Q4/2023 Linienbestimmung
Radverkehrsanlagen, Anpassungen	Sicherheitsstrennstreifen, Rotmarkierungen	diverse	Planung							
Radvorrangroute Haaren	von Bushof bis Haaren-Mitte		Vorplanung					2024		
Radvorrangroute Vaals	von Grabenring bis Vaalserquartier		Vorplanung							Q4/2023 Programmberatung
Radvorrangroute Berensberg	Von Alleenring bis Stadtgrenze Berensberg		Vorplanung							
Radverteiler Grabenring	Umgestaltung nach RVR-Konzept	Gesamt	Vorplanung							Beauftragung Planungsbüro für diverse Teilaabschnitte
Raerener Str. (35 - 49)	Kanalsanierung und Vollausbau, Entwässerungsproblem		Planung					2024		
Raerener Straße	Entwässerung, Straßenwasser entwässert auf private Fläche		Planung					2024		
Richtericher-Dell	Ortsumgehung		Planung					2026ff		
Roermonder Straße	Neumarkierung und Anpassung	Kackerstraße - Schlosstraße	Planung	Q3/23	Q3/23					
Rombachstraße	Teilstück der RVR Brand		Planung	Jun 23	Aug 23					
Saarstraße	Überplanung/Neumarkierung		Vorplanung							Q1/2024 Programmberatung
Salierallee	Erneuerung Fahrbahn + Nebenanlagen nach Regionetz		Vorplanung					2025		
Sandhäuschen - Laurentiusstraße	B-Plan, Erschließung - Endausbau		Planung					2024		
Scheibenstraße	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlage		Planung					Q4/2023		
Sonnenweg, Entwässerung	Entwässerung		Bau					Q2/2023	Q2/2023	
Sonnenweg, Kfz Sperre	Verhinderung von Durchgangsverkehr		Bau					Q2/2023	Q2/2023	
Sophienstraße (Viktoriastraße bis Pastorplatz)	Erneuerung Fahrbahn + Nebenanlagen		Planung					2024		
St. Germanus Umfeld	Neugestaltung Kirchenumfeld		Planung					2022		
Starkregen	"Arbeitshilfe zum Starkregenmanagement", div. Abstimmungen (mit Dez VII)		Planung					laufend		
Stromgasse	Erneuerung Fahrbahn + Nebenanlagen nach Regionetz		Planung					2024		
Südstraße	Fahrradstraße nach Regionetz-Maßnahme	Gesamt	Vorplanung							
Talstraße	Erneuerung Fahrbahn und Nebenanlage	inkl. Stichweg	Bau		12.09.2019	01.12.2022	16.11.2022	Q2/2023	Q4/2023	geschätzte Bauzeit 5-6 Monate
Theaterplatz	Umgestaltung		Planung					2025ff		
Tholen	Gerichtsverfahren - Tausch Bettungsmaterial Nebenanlagen							2023 ff		
Trierer Straße	Nebenanlagen nach Regionetz	Abschnitt Forst/Schönforst	Planung							
Turmstraße	Umgestaltung/Markierung nach Brückensanierung		Planung	Q3/23	Q3/23					
Urbanstraße	Endausbau		Planung					2024		
Vaalsen Straße	Ertüchtigung Radverkehrsanlage	Kellenstraße bis Grenze	Bau				23.06.2022	Q3/2023	Q3/2023	Weißmarkierung und Beschilderung über E18, Roteinfärbung und Flexpoller über /700
Vaalsen Straße	Radentscheidkonformer Knotenumbau	Amsterdamer Ring/Halifaxstraße	Vorplanung							Q3/2023 Programmberatung
Vaalsen Straße/An der Schanz	Ertüchtigung Radverkehrsanlage	Umfeld Unfallstelle	Vorplanung							Q1/2024 Programmberatung
Vennbahnweg	"Pockelpark" Aufteilung Vennbahnweg in Geh- und Radweg	Trierer Straße bis Rombachstraße	Planung					2023		
Vennbahnweg	Verbreiterung		Planung	div Termine	30.09.2021		30.09.2021			
Verlaulenheidener Straße	Ortseingang		Abrechnung				Mitteilung Verwaltung	Q2/2023		
Verpflichtungsbereich Harscampstraße, Schildstraße und -platz	Erneuerung Fahrbahn + Nebenanlagen		Planung					2024/2025		
bereits angekündigte Kleinmaßnahmen:										
Adalbertsteinweg / Sedanstraße / Elsasstraße										
Löhergraben/Alexianergraben										
Peterstraße / Gasborn										
Vaalsen Straße / Pariser Ring										
Krefelder Straße / Passstraße										
Reichsweg/Trierer Straße										
Vaalsen Straße										
Eynaltenerstraße										
Hochstraße / Rollefstr.										
Erzbergerallee / Im Grünial										
Danzigerstraße Rampe, Radvorrangroute Brand, Minimaßnahmen										
Freunder Weg / Ecke Malarestraße										
An der Schanz / Im Johannistal										
Kaiserplatz										

Mitteilung der Verwaltung zur Sitzung des Mobilitätsausschusses am 11.05.2023

Sachstand „Fahrradparken an Bahnhöfen“

Mit der Annahme des Radentscheides 2019 wurden auch die Ziele 5a und 5b angenommen. Diese besagen, dass 2.500 Plätze in bewachten Fahrradparkhäusern an Bahnhöfen mit hohem Pendleraufkommen (Ziel 5a) bzw. 2.500 überdachte, beleuchtete Plätze an weiteren Bahnhöfen und Haltestellen geschaffen werden sollen.

Für den Standort Hauptbahnhof Aachen ist beim dortigen Neubauvorhaben „Bluegate“ ein Fahrradparkhaus mit rund 400 Stellplätzen geplant. Zwischenzeitlich konnte ein neuer Generalunternehmer gefunden werden, sodass die Arbeiten dort wieder aufgenommen werden konnten. Der neue Standort der Radstation soll im kommenden Jahr fertiggestellt werden. Zwischenzeitlich haben weitere Abstimmungen mit den beiden Betreibern (APAG und WABe e.V.) stattgefunden. In einem gemeinsamen Workshop im DigitalHUB wurden Möglichkeiten erarbeitet, die beiden zukünftigen Standorten (Bahnhofstraße und Bluegate) digital miteinander zu vernetzen. Es finden laufend weitere Abstimmungen mit der Verwaltung statt.

Für den Bahnhof Rothe Erde wurde im vergangenen Jahr ein Gutachten zum Fahrradparken in Auftrag gegeben. Ziel war die Ermittlung potenzieller Flächen für das gesicherte Parken, sowie die Machbarkeit, auf den Potenzialflächen Fahrradparken anbieten zu können. Die Ergebnisse des Gutachtens liegen seit Ende April vor. Die Verwaltung hat auf Grundlage der Ergebnisse beim Förderaufruf „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ des Bundesamtes für Logistik und Mobilität eine Projektskizze zur Interessensbekundung eingereicht.

Auch der Westbahnhof war Teil des beauftragten Gutachtens. Laut Gutachter ist am Westbahnhof auf Grund der geringen Flächenverfügbarkeit eine große Lösung im Sinne eines Fahrradparkhauses bisher nicht möglich. Mehrere kleine Anlagen (wie z.B. die Anlage in der Brabantstraße mit 8 Stellplätzen) wären denkbar. Zu beachten ist allerdings die künftige Weiterentwicklung des Westbahnhofes und des Republikplatzes. Weitere Abstimmungen und Planungen zu gesicherten Fahrradabstellanlagen müssen im Zusammenhang mit dieser Entwicklung betrachtet werden.

Am Bahnhof Schanz wurde bereits eine Sammelschließanlage über das Förderprojekt #AachenMooVe! errichtet. Die Anlage bietet gesicherte und überdachte Stellplätze für 32 Fahrräder. Aktuell läuft ein Test des künftigen Betreibers. In Kürze soll die Anlage für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.



**Auszug aus der
Niederschrift
der Sitzung der Kommission Barrierefreies Bauen**

Sitzungstermin: Montag, 17.04.2023

Sitzungsbeginn: 15:00 Uhr

Sitzungsende: 17:55 Uhr

Ort, Raum: Zoom-Konferenz

Zu TOP 4 - Mündlicher Sachstandsbericht Planungs- und Baumaßnahmen Straße

Beschluss der Kommission:

Die Kommission würde gerne Stellung nehmen, leider ist aber keine Vorlage zum Tagesordnungspunkt vorhanden. Es ist auch kein mündlicher Bericht in einer Sitzung der Kommission erfolgt.

Zu TOP 5 - Baustellenübersicht

Beschluss der Kommission:

Die Kommission würde gerne Stellung nehmen, leider ist aber keine Vorlage zum Tagesordnungspunkt vorhanden. Es ist auch kein mündlicher Bericht in einer Sitzung der Kommission erfolgt.

Zu TOP 14 - FB 61/0645/WP18 - „Das grün-blaue Band - vom Verkehrsraum zum Lebensraum“ Begrünung, Bachoffenlegung und Spielpunkt in Klappergasse und Rennbahn – Planungsbeschluss

Beschlüsse der Kommission vom 27.02.2023 auf Grundlage des Planes vom 12.10.2022:

Die Bachrinne muss durch eine kleine Aufkantung von mindestens 2 - 3 cm geschützt werden, damit Rollstuhl- und auch Rollatorenfahrer*innen dort nicht einfach hineinrollen können.

Weiterhin müssen auch die hochgradig Sehgeschädigten diesen Bachlauf optisch wahrnehmen können, es müssen also Kontraste vorhanden sein. Die Gestaltung grau in grau ist nicht barrierefrei. Das geschnittene Pflaster muss mit einem Leitelement mit Kontraststreifen versehen werden, so dass es damit wieder sichtbar wird. Weiterhin müssen zwei sichere Querungen zum Überqueren der Rinne eingebaut werden.

Herr Kemper wird seitens der Kommission gebeten, hierzu weitere Planungen zu entwickeln und diese dann nochmals in der Kommission vorstellen.



Aktueller Beschluss der Kommission auf Grundlage der Vorlage vom 15.03.2023:

Die Bushaltestelle an der **Jakobstraße** sollte einen Wartestand erhalten. Der Gehweg sollte hier, entsprechend der Regelwerte, mind. 2,70 m breit sein. Auch eine Breite von 3 m wäre sinnvoll, da ein hohes Aufkommen von Fußgänger*innen zu erwarten ist. Das Leitsystem mit haptisch und optisch kontrastierendem Leitstreifen und gut berollbarem Belag ist zwar in dieser Planungstiefe noch nicht eingezeichnet, sollte aber sowohl über als auch um den Platz führen. Auch das starke Gefälle des Platzes macht diese beiden Führungen am Platz erforderlich. Die Fahrradparkplätze sollten so eingeplant werden, dass sie auch bei doppelter Nutzung an einer Seite des Radbügels nicht in die Lauffläche des Bürgersteigs ragen. Bei dem aktuell vorliegenden Entwurf sind dann mind. 3 m Bürgersteigbreite vorzusehen.

In der **Klappergasse** sollte der Gehweg auf Dauer barrierefrei angelegt werden. Mosaikpflaster ist nicht barrierefrei, da die einzelnen Mosaiksteine leicht absacken können und so zu Stolperfallen werden. Hier sollte im Sinne der Verkehrssicherheit für die Fußgänger*innen ein ebener Belag und ein Leitsystem angelegt werden, da ansonsten diese Seite nicht von Menschen mit Behinderungen genutzt werden kann. Grundsätzlich müssen die Mindestgehbreiten von 2,70 m (H BVA) eingehalten werden. Dies ist auf der Südseite mit teils nur „mangelhafter“ 1,50 m Breite nicht gegeben. Daher sollte hier im weiteren Planungsverlauf eine Möglichkeit der Verbreiterung des Gehweges vorgesehen werden.

Das OVG NRW hat hierzu festgestellt, dass ein Gehweg nicht in seiner Funktion beeinträchtigt werden darf. (siehe oben unter TOP 10). Dies ist bei 1,50 m nicht gegeben. Eine Steigerung der Barrierefreiheit durch niveaugleiche Gehwege und Fahrbahn kann nur dann erreicht werden, wenn die Gehwege baulich geschützt sind und so ein Befahren durch Fahrradfahrende verhindert wird. Ansonsten kommt es dann doch wieder zu gefährlichen Situationen auf dem Gehweg, da ja die Wasserrinne ein schnelles Wechseln der Fahrradfahrenden auf die Fahrbahn verhindert.

Platz an der Klappergasse

Die Kommission begrüßt, dass die Fahrradparkplätze weit von dem Gehweg entfernt platziert werden. Der gesamte Bereich soll mit vorhandenem Blaubasalt-Kleinpflaster wiederhergestellt werden. Daher sollte dann dieser Bereich komplett barrierefrei mit geschnittenem Grauwacke-Pflaster und kleinen Fugen (festverfugt) ausgestattet werden. Sollte bei der Rundbank aufgrund der Wünsche der Bürger*innen das Wasser aufgeweitet werden, ist die Barrierefreiheit hier insbesondere zu beachten. Die Breite des Gehweges einschließlich kompletten Leitsystem muss mind. 2,70 m betragen, auch wenn die Rundbank näher an das Wasser gerückt werden soll. Das Leitsystem sollte auch über den Platz führen.

Platz an der Bendelstraße

Südlich des Beetes sind in der aktuellen Planung 4 Radbügel eingezeichnet. Hier bittet die Kommission darum, die Radbügel so zu installieren, dass sie auf keinen Fall in den Gehweg ragen können. Sie sollten also vom nur 2,50 m breiten Gehweg mind. noch 50 cm entfernt sein, so dass auch eine fehlerhafte Nutzung die Breite des Gehweges nicht weiter reduziert. Das Leitsystem sollte auf jeden Fall auch zum Spielplatz (§ 8 BauO NRW) und auch über den Platz führen. Die umrandete Mauer mit Sitzauflagen sollte auch teils mit Rückenlehnen ausgestattet werden, so dass Menschen mit Behinderung und ältere auch diese Sitzgelegenheiten nutzen können; ebenso sollte eine Stellfläche für Rollstuhlfahrer*innen dort vorgesehen werden.

Kommission Barrierefreies Bauen in der Stadt Aachen



Die seichte Wasserfläche um den Brunnen muss auf jeden Fall mit einem optisch und haptisch kontrastierenden Leitsystem ausgebildet werden, damit Menschen mit Sehschädigung oder blinde Menschen nicht ungewollt nasse Füße bekommen.

Straßenraum Rennbahn

Der zugrundeliegende Gedanke die Rennbahn wie eine Fußgängerzone aussehen zu lassen und gleichzeitig den Fußgänger*innen den Vorrang zu geben ist gut, wenn die Fußgänger*innen vor dem Verkehr und insbesondere dem zu erwartendem hohem Aufkommen von Radverkehr geschützt werden. Das heißt also, dass die niveaugleiche Ausführung also so gestaltet werden muss, dass ein geschützter Lauf-Bereich entsteht. Das geschnittene Großpflaster sollte mit geringem Fugenanteil und auch festverfugt werden, damit Rollstühle, Kinderwagen und Rollatoren dort nicht „hängen“ bleiben können. Für die Fahrradparkplätze gilt das gleiche wie bereits oben ausgeführt – der Gehweg muss mind. 2,50 m plus 50 cm breit sein, damit parkende Räder nicht in die „Gehwegfläche“ ragen. Gerade hier ist der Gehweg durch das Pflanzbeet geschützt, daher sollte hier dringend darauf geachtet werden.

Der gesamte Gehwegbereich sollte mit einem kompletten optisch und haptisch kontrastierendem Leitsystem ausgestattet werden – auch in der Fußgängerzone. Gerade in dem Bereich um das Weltkulturerbe ist mit hohem Fußgänger*innenaufkommen zu rechnen, daher sollte hier die Barrierefreiheit vollumfänglich realisiert werden.

Mobilitäts- ausschuss

11.05.2023

Herzlich willkommen!

www.aachen.de

15 von 72 in Zusammenstellung



Mobilitätsausschuss

11.05.2023

Öffentlicher Teil

Ö1: Eröffnung der Sitzung

Ö2: Genehmigung der Niederschrift vom 20.04.2023

Ö3: Gemeinsame Resolution der NRW- Aufgabenträger für eine nachhaltige Finanzierung des Nahverkehrs

Ö4: Mündlicher Sachstandsbericht

Planungs- und Baumaßnahmen Straße

Ö5: Baustellenübersicht

Präsentation anzeigen

Baustellenübersicht

Fokus Tief- und Straßenbau

1. Baustellentypen
2. Beispiele Aachen Mitte + Notmaßnahmen
3. Baustellenkoordination

Baustellenübersicht

1. Baustellentypen

Erhaltung / Sanierung des Straßenkörpers
Notmaßnahmen
Maßnahmen infolge politischer Beschlüsse

Baustellentypen

Erhaltung und Sanierung des Straßenkörpers

Neubaumaßnahmen

- Verlegung / Sanierung von Versorgungsleitungen
- Strom, Gas, Wasser, Fernwärme
- Kanäle, Hausanschlüsse, Erschließung Neubauten
- Fernmeldeleitungen (Glasfaser)
- Krangestellungen, Bau- und Ladearbeiten
- Antrag bei FB 61/400
- Koordination (Eingriff in den Straßenraum, Konflikte mit anderen Baustellen, Zeitliche Abfolgen, Verkehrsfluss aufrechterhalten)
- Planvereinbarungen vorab → Grundsätzliche Klärung vor Antragsstellung

Unterhaltungsmaßnahmen

- Maßnahmen, welche zum Unterhalt der Straßen und Nebenanlagen im Stadtgebiet dienen
- Erhaltung oder zur Sanierung einer Straße
- Asphalterneuerung, Markierungsarbeiten, Brückenbauwerke
- Genehmigung und verkehrsrechtliche Anordnung eigenständig durch E 18



Baustellenübersicht

Erhaltung und Sanierung des Straßenkörpers

- FB 61/400 bündelt alle dort in Zuständigkeit befindlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Zu beachten sind der Verkehrsfluss, ÖPNV Anbindungen, zeitliche und örtliche Konflikte von Baumaßnahmen, Prioritäten in der Durchführung, Veranstaltungen, Großprojekte im Tief- und Straßenbau sowie auch im Hochbau mit Auswirkung auf die Verkehrsführung, Rad- und Fußgängerführung
- HINWEIS → jede Notmaßnahme stört die vorher geschehene Koordination

Baustellentypen

Notmaßnahmen

- Der Natur nach unvorhersehbar im Beginn sowie in Dauer
- Große Unbekannte in der Koordinationsarbeit
- Wasserrohrbrüche, Gaslecks, Absackungen von Straßen, etc.
- Schnellstmögliches Handeln ist verlangt.
- Im Nachgang können Anpassungen an den laufenden Baumaßnahmen erst geprüft und umgesetzt werden.


Baustellentypen

Maßnahmen infolge politischer Beschlüsse

- Zuständigkeiten bei Baumaßnahmen aus politischen Entscheidungen liegt u. a. bei FB 61
- z. B. Fahrradstraße, Radvorrangrouten, Radschutzstreifen, Protected Bike Lanes, Premiumfußwege, Real-Labor Theaterplatz & Templergraben, Tempo 30 Zonen, Aufstellung von Fahrradbügeln, Velo City Stationen, Einbau von Verkehrsinseln, etc.
- Die Umsetzung dieser erfolgt neben der Sicherstellung der Baumaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgungsleitungen und weiterer v. g. Baustellentypen

Baustellenübersicht

2. Beispiele AC-Mitte | Notmaßnahmen

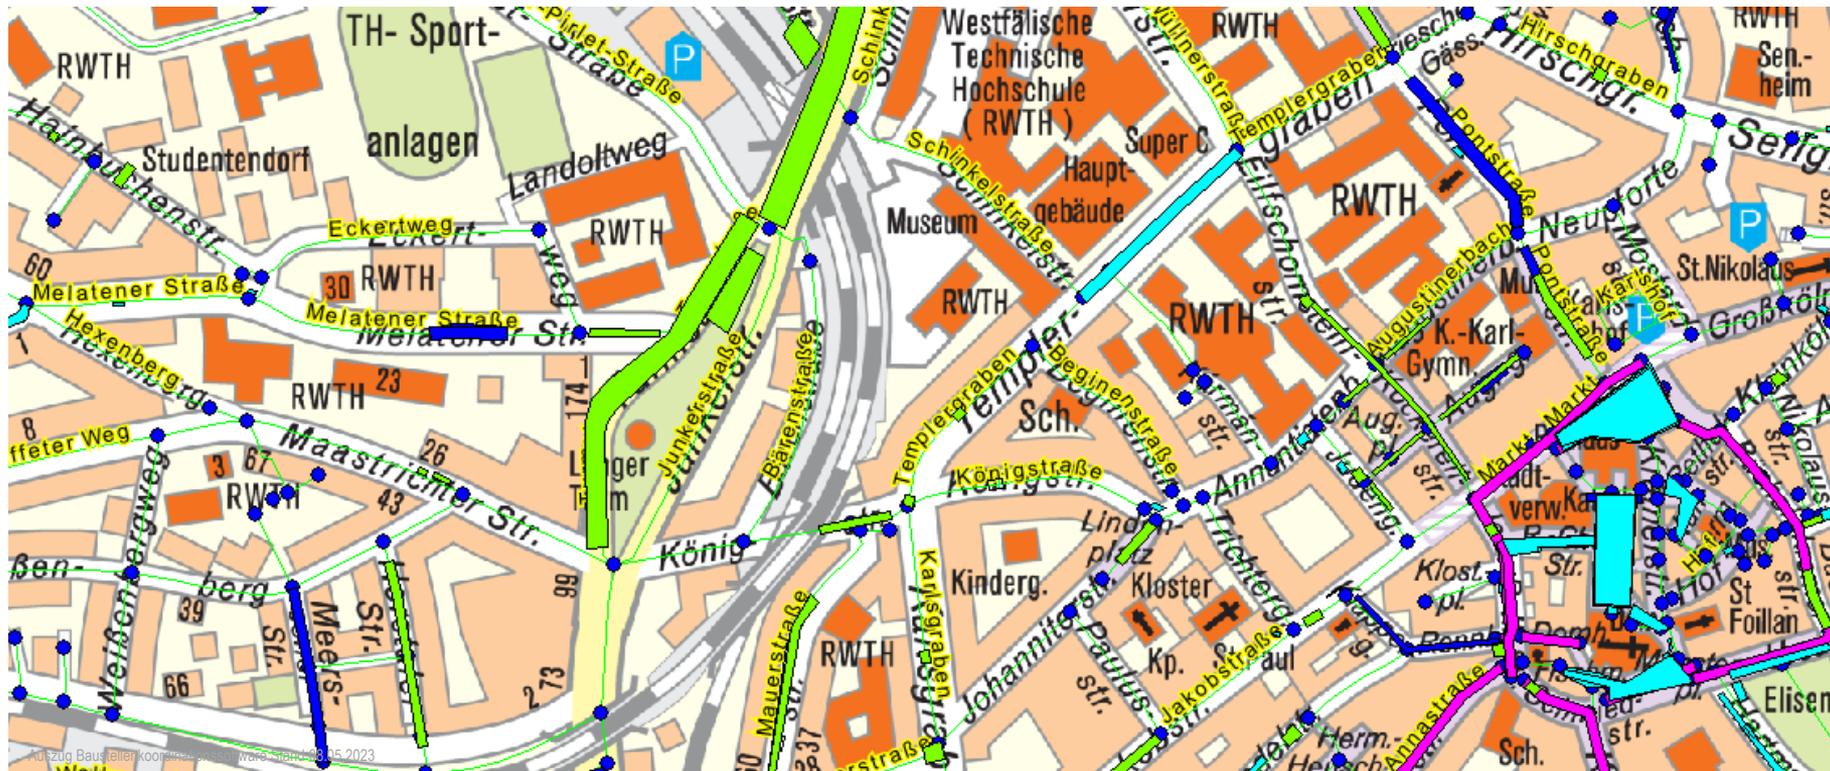

Beispiele Aachen Mitte + Notmaßnahmen

Grün=laufende BM + Haltverbote + Notmaßnahmen, Blau=Geplante BM / Planvereinbarungen, Magenta=Veranstaltungen, Türkis=Sondernutzungserlaubnis

Baustellenübersicht

Beispiel Großbaustellen + Notmaßnahme Königstraße

Großbaustellen

- Neubau Brücke Turmstraße
- Schatten Baumaßnahme Turmstraße Regionetz
- Da weniger Verkehr aufgrund der Brückensperrung auf der Turmstraße zu erwarten war, wurde die weitere Großbaustelle des Neubaus der Versorgungsleitungen hinzu koordiniert
- Symbiose der Verkehrsführung in Umleitungsverkehr und Vermeidung von weiteren Umleitungen für MIV sowie ÖPNV und Radfahrer*innen | Fußgänger*innen

Notmaßnahmen in der Königstraße zwischen 01/2022 und 05/2023

Störung Telekommunikation 04.02.2022 HS 37
bis 04.05.2022

Auswirkung auf Karlsgraben kamen hinzu

Wasserschaden 04.03.2022 HS 68-70
bis 01.04.2022

Gasleitungsleck 13.06.2022 HS
bis 14.06.2022

Auswirkungen auf Karlsgraben und Templergraben

Baustellenübersicht

Beispiel Großbaustellen + Notmaßnahme Königstraße

Großbaustellen

- Neubau Brücke Turmstraße
- Schatten Baumaßnahme Turmstraße Regionetz
- Da weniger Verkehr aufgrund der Brückensperrung auf der Turmstraße zu erwarten war, wurde die weitere Großbaustelle des Neubaus der Versorgungsleitungen hinzu koordiniert
- Symbiose der Verkehrsführung in Umleitungsverkehr und Vermeidung von weiteren Umleitungen für MIV sowie ÖPNV und Radfahrer*innen | Fußgänger*innen

Notmaßnahmen in der Königstraße zwischen 01/2022 und 05/2023

Wasserrohrbruch 12.12.2022 HS 68
bis 27.12.2022

Auswirkung bis auf Karlsgraben kamen hinzu

Wasserschaden seit 18.04.2023 HS 51 bis Karlsgraben
Arbeiten dauern an
Vollsperrung

Zwischenzeitlich wurden auch geplante BM durchgeführt

Baustellenübersicht

3. Baustellenkoordination

Auf welcher Basis koordinieren wir?

Was muss beachtet werden?

Geänderte Arbeitsschutzrichtlinien und die Konsequenzen für Aachen

Baustellenkoordination

Auf welcher Basis koordinieren wir?

Grundlagen:

→ abteilungs- und fachbereichsübergreifende und auf langfristige Planung
ausgerichtete **Infrastrukturgespräche**

- konkurrierende Baumaßnahmen werden identifiziert
- Konkurrenz : Lage der Baustelle selber oder Baustelle liegt auf einer Umleitungsstrecke
- in Abhängigkeit der zu erwartenden Beeinträchtigungen werden Maßnahmen nicht gleichzeitig durchgeführt

→ quartalsweise **Baustellenkoordinierungsgespräche** mit Versorgungsträgern,
Straßenbaulastträger, Baubetriebshof, ASEAG, Polizei, Bezirken etc.

Baustellenkoordination

Auf welcher Basis koordinieren wir?

- Geplante Maßnahmen für das laufende und ggf. auch für das folgende Jahr
- Abläufe koordinieren und ggf. Maßnahmen schieben
- Private Baumaßnahmen in die Planungen einbeziehen
- Notmaßnahmen flexibel und sofort koordinieren
- Umfangreiches Protokoll, Baustellenliste, Stadtplan

Baustellenkoordination

Wer macht was?

- EDV-unterstütztes Baustellenmanagement – Bündelung der Verkehrsanordnungen bei FB 61/400 (Straßenverkehrsbehörde) für eigene Maßnahmen und Maßnahmen Dritter
- Aachener Stadtbetrieb fertigt für Unterhaltungsmaßnahmen Verkehrsanordnungen in eigener Zuständigkeit;
- Straßen.NRW und die Städteregion fertigen als Straßenbaulastträger Verkehrsanordnungen in eigener Zuständigkeit
>> Straßenverkehrsbehörde wird angehört
- Autobahn GmbH fertigt als Straßenbaulastträger Verkehrsanordnungen in eigener Zuständigkeit auf den Autobahnen selbst.
>> Straßenverkehrsbehörde wird angehört
>> Die Umleitungen über „Stadt“-Straßen müssen durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden.

Baustellenkoordination

Was muss beachtet werden?

- Belange der Verkehrsteilnehmer*innen, des ÖPNV, der Feuerwehr, der Müllabfuhr, Wegfall von Parkplätzen
- Geänderte Arbeitsschutzrichtlinien für Baustellen seit Dezember 2018

**Behandelt den
Schutz der Beschäftigten
im Arbeitsfeld**



**Behandelt den Schutz
der Verkehrsteilnehmer
außerhalb des
Arbeitsfeldes**

- Freier Bewegungsraum zur Ausführung der Arbeiten **plus** Sicherheitsabstände zum fließenden Verkehr

Baustellenkoordination

Was muss beachtet werden?



Ö5: Baustellenübersicht

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ö6: Prioritätenliste Kleinmaßnahmen 2023

Ö7: Prioritätenliste

Bewohnerparkzonen

Präsentation anzeigen

Ö8: Straßenbeleuchtungsanlagen – Prioritätenliste 2023

Ö9: „Das grün-blaue Band – vom Verkehrsraum zum Lebensraum“

Begrünung, Bachoffenlegung und Spielpunkt in Klappergasse und Rennbahn – Planungsbeschluss

Präsentation anzeigen

Das grün-blaue Band

Bachoffenlegung in Klappergasse und Rennbahn



Das grün-blaue Band

Inhalt der Präsentation

- Förderantrag und Grundlagen
- Machbarkeitsstudie „Aachener Bäche sichtbar und erlebbar machen“ (PLA 14.11.2019)
- Varianten für Gerinneführung (PLA 8.12.2022)
- Die aktuelle Planung

Der Förderantrag


Bundesprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel

...Die Bundesregierung stellt zur weiteren Förderung von Maßnahmen zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel 2022 in einer 3. Tranche weitere 176 Millionen Euro aus dem Sondervermögen „Klima-und Transformationsfonds“ zur Verfügung. Mit dem Projektaufruf vom 15.07.2022 sind Kommunen aufgefordert, bis zum 15.10.2022 Projektskizzen einzureichen. ...

Der Förderantrag

Aachener Stadtklimaanpassungskonzept (2014)

-> Vorsorgebereich Stadtklima

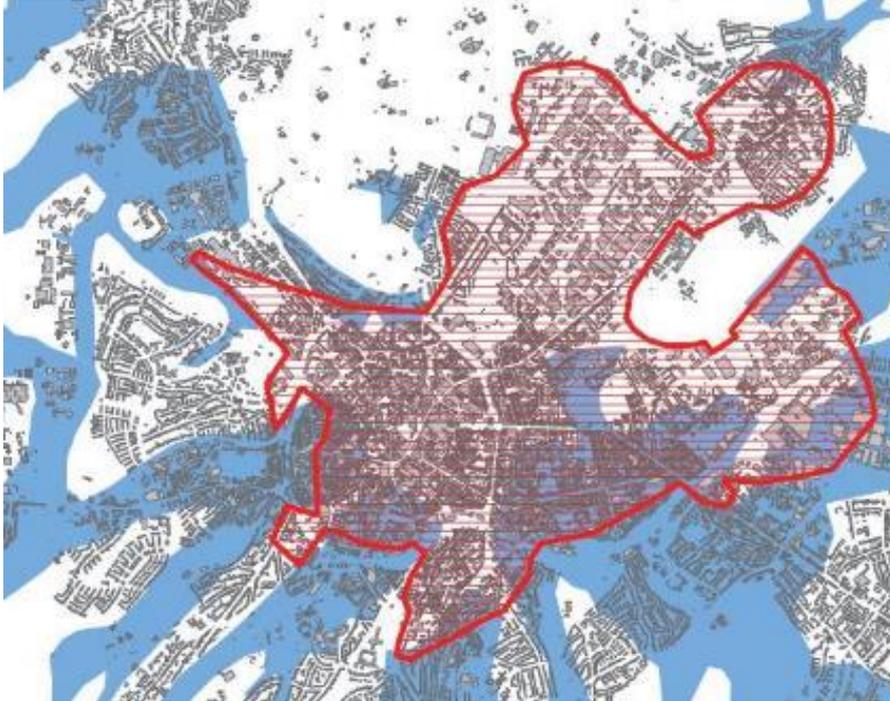

Im Aachener Freiraumkonzept, ebenso wie im aktuellen Flächennutzungsplan (2022), ist dieser als 'Schutzbereich Stadtklima' übernommen worden.

Für die betreffenden Siedlungsstrukturen wird die Entsiegelung und Begrünung von Flächen sowie generell die Erhaltung, Schaffung und Vernetzung neuer Grünräume empfohlen.

Darüber hinaus wird bereits im Stadtklimaanpassungskonzept von 2014 für die Innenstadt die „Schaffung offener Wasserflächen“ als Maßnahme benannt.

Der Förderantrag

Innenstadtkonzept 2022

In den integrierten Stadtentwicklungskonzepten Innenstadtkonzept 2022 (ISK 2022) und auch dem Masterplan Aachen*2030 war das Thema der Bachoffenlegungen bereits grundsätzlich verankert und als Ziel benannt.


Die Sichtbarmachung von Bachverläufen werden von allen am Erarbeitungsprozess Beteiligten übereinstimmend als **eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der Innenstadtentwicklung** angesehen.

Der öffentliche Raum mit dem Angebot von attraktiven Straßen, Plätzen und Parks ist das Aushängeschild einer Stadt und als Lebensraum für alle Zielgruppen gleichermaßen wichtig.

Eine hochwertige Gestaltung und gute Aufenthaltsqualitäten sind **Garanten für eine vitale Innenstadt.** (vgl. ISK 2022, S. 73).

Der Förderantrag

Innenstadtkonzept 2022, Temperaturbelastung und Versiegelung

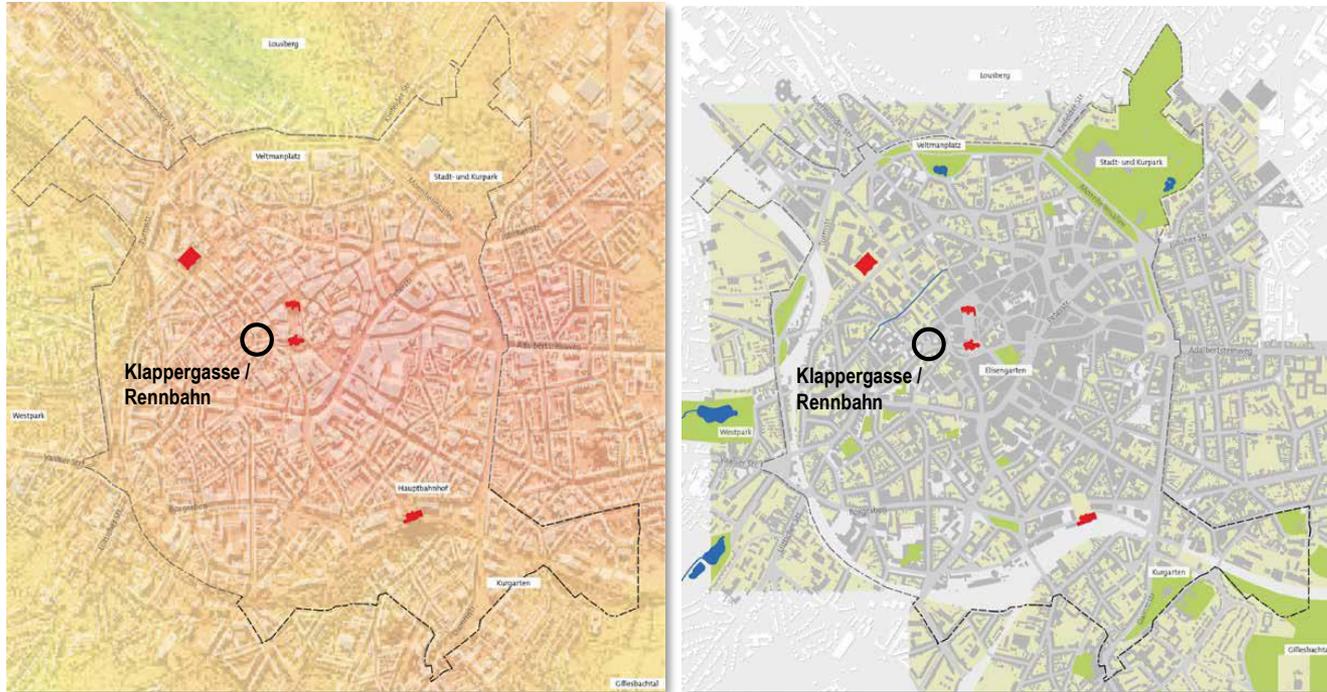

Temperaturbelastung (Perspektive 2030) und Versiegelung (vgl. ISK 2022, S.50/51)


Der Förderantrag

Integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Aachen (2018)

- Förderung der Klimaanpassung in Bestandsquartieren
- Reduzierung der Wärmebelastung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität; Möglichkeiten zur Kühlung über Verschattung / Verdunstung
- Sicherung und Verbesserung der Wasserrückhaltung in der Fläche
- Schaffung von klimaökologischen 'Komfortinseln' im Siedlungsbereich, Erholungs- und Ausgleichsflächen
- Erhalt und Offenlegung von Gewässern

Der Förderantrag

Freiraumkonzept Grüne Krone

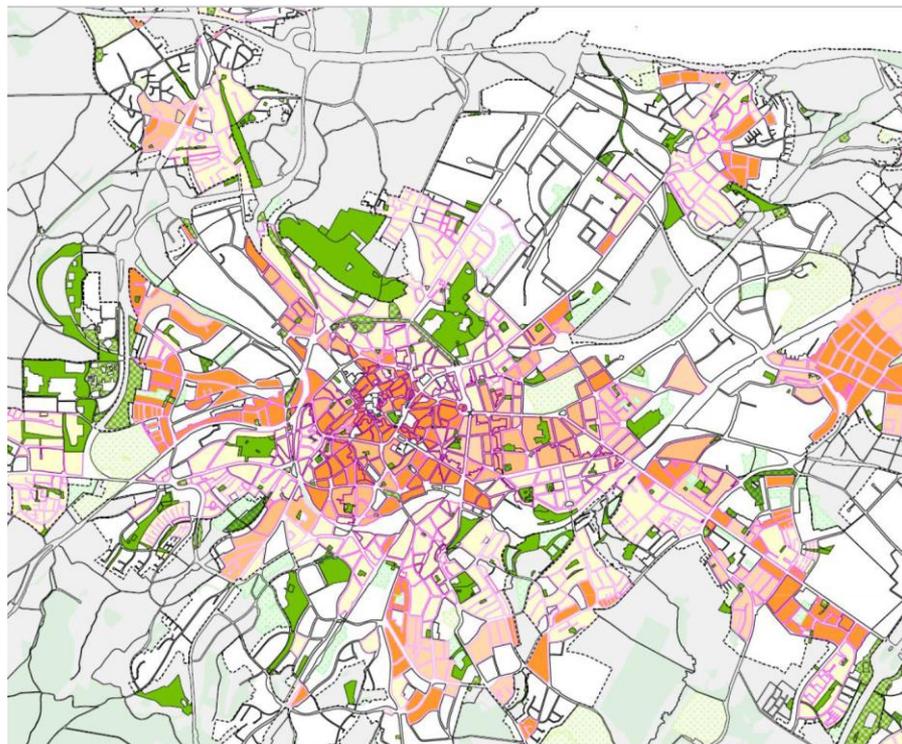

Darstellung jeweils für Baublocke, Einwohnerdaten von 2015

	nicht erfasst	unter 50 Einwohner / ha
	versorgt	(> 6 m ² / Einwohner)
	unterversorgt	(3 - 6 m ² / Einwohner)
	stark unterversorgt	(0,1 - 3 m ² / Einwohner)
	nicht versorgt	< 0,1 m ² / Einwohner

Versorgung mit privaten oder halböffentlichen Grünflächen

	nicht erfasst	unter 50 Einwohner / ha
	gut	
	gering	
	extrem gering	

Grünanlagen

	nutzbar
	eingeschränkt nutzbar wegen Lärm
	eingeschränkt nutzbar wegen Qualität

Friedhof

Kleingartenanlage

Wald

Außenbereich

Die Machbarkeitsstudie

Inhaltliche Zielsetzungen

- Bäche und Quellen sichtbar und erlebbar machen,
- Aufenthaltsqualität erhöhen
- Wasser als stadträumlichen Standortfaktor nutzen
- Aspekte der Aachener Geschichte lesbar machen
- Mikroklima verbessern (Klimafolgeanpassung in Stadträumen)
- Erarbeitung stadträumlicher, bau- und wasser-technischer sowie gestalterischer Anforderungen und Potentialen



Quelle auf dem Rathausplatz in Esch-sur-Alzette erinnert an die darunter fließende Alzette



Offene Bachrinne in Amiens (Winter)





Offene Bachrinne

Fotos: archigraphus

Die Machbarkeitsstudie

Bach-Erlebnisse in der Innenstadt

- Erarbeitung beispielhafter Lösungen für markante Orte
- Offene Gerinne für Aachen nach historischem Vorbild /Inszenierung
- Baustein Klappergasse und Rennbahn
- Baustein Willy-Brandt-Platz / Varianten
- Baustein Synagogenplatz

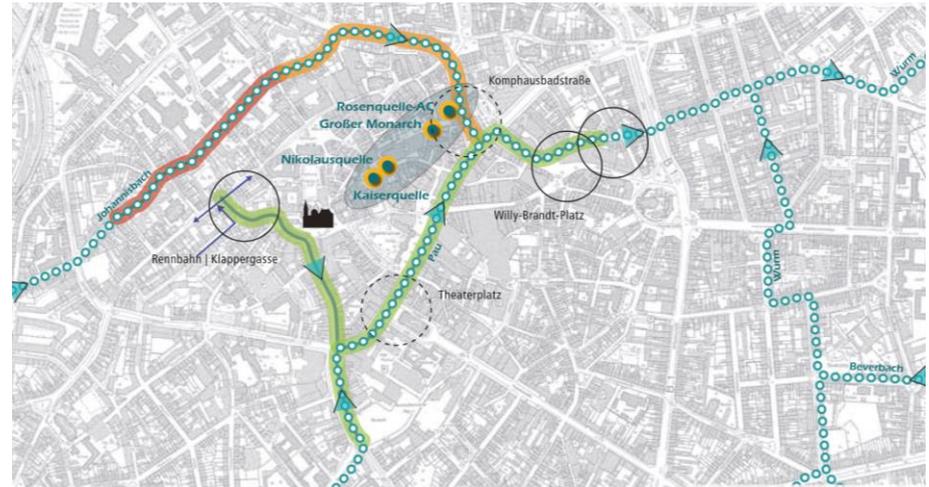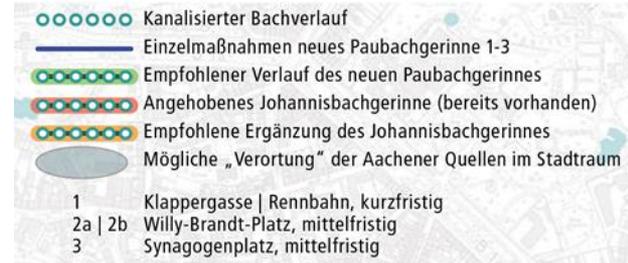

Die Machbarkeitsstudie

Voruntersuchung für Klappergasse und Rennbahn, Lageplan



Die Machbarkeitsstudie

Visualisierung

- Erlebbarkeit von Wasser in Anlehnung an historische Nutzung: offene Rinne über ehemalige Mühle bis zum Fischmarkt
- Potential hoher Aufenthaltsqualität : Spielen, Ruhen, Erleben
- Lage am Premiumfußweg Richtung Johannistal




Die Initiative „Aachener Bäche ans Licht“

Wasser-Event 2021



Varianten zur Gerinneführung

Klappergasse bis Graben

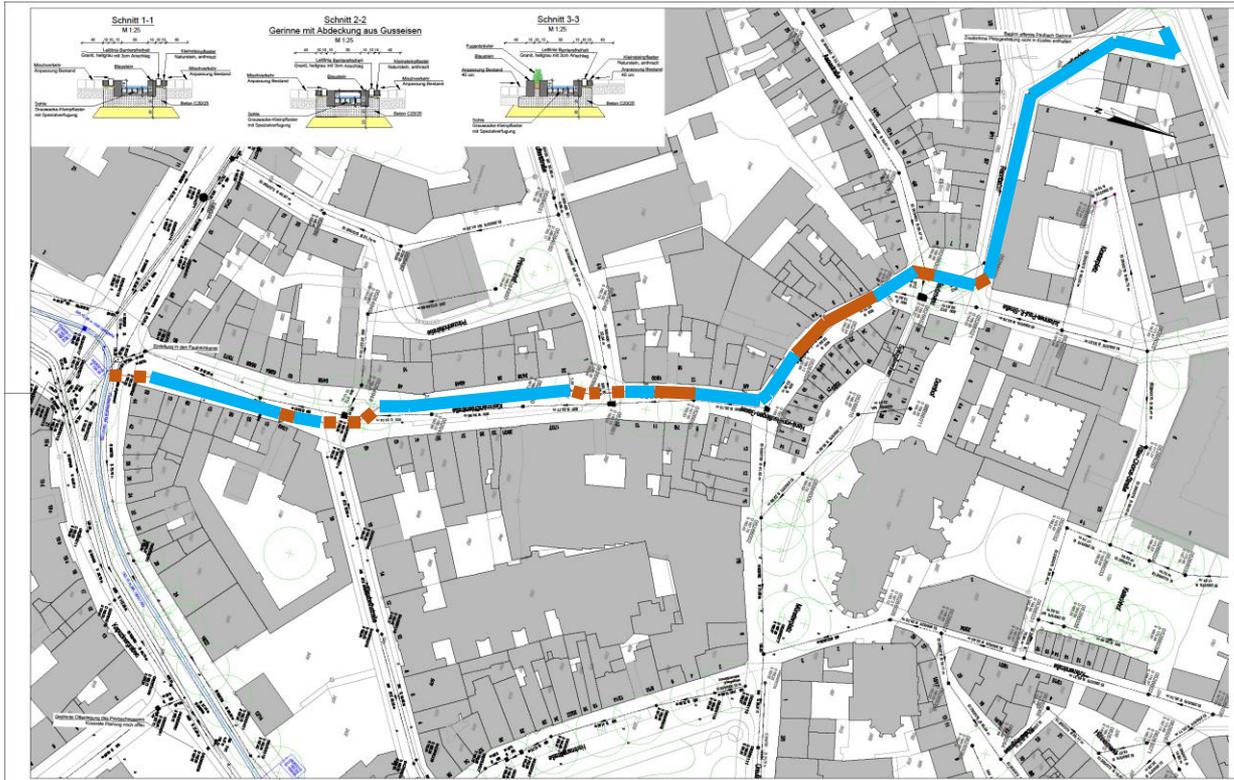

- Offenes Gerinne 
- Abgedecktes Gerinne 
- Verrohrtes Gerinne 

Die aktuelle Planung

Klappergasse und Rennbahn



Lageplan Bestand

Die aktuelle Planung

Klappergasse und Rennbahn




Vorplanung







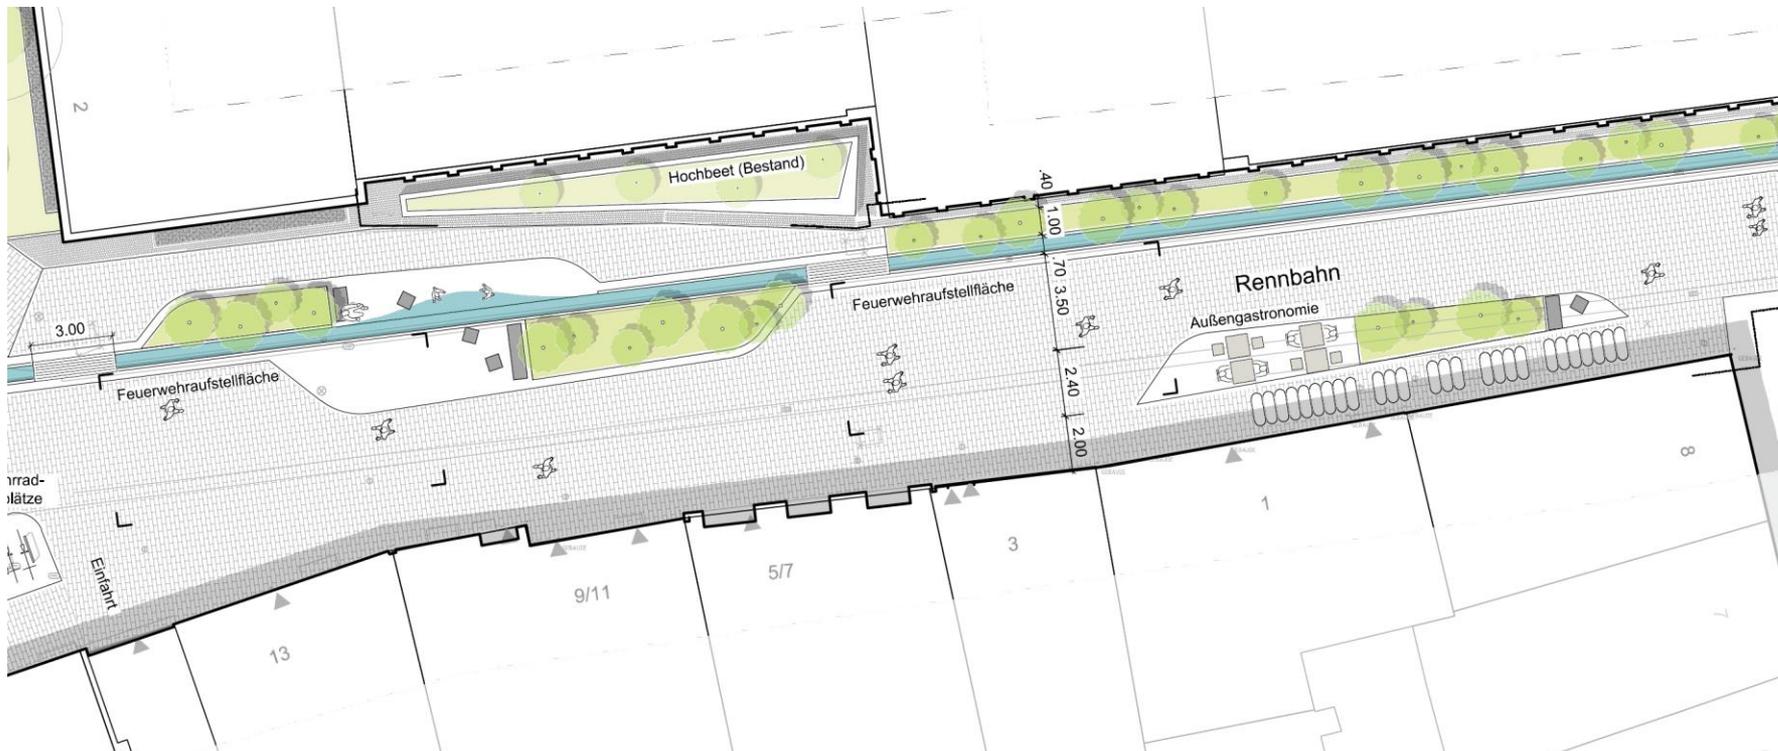

Die aktuelle Planung

Zeitschiene für den Abschnitt Klappergasse und Rennbahn
(in Abstimmung)

Okt. 2022 – Nov. 2022: Förderantrag

Jan. 2023 – März 2023: Vorentwurf + Vorlage

April 2023 – Mai 2023: Planungsbeschluss

19. Mai 2023: Förderantrag 2. Stufe

Juni 2023 – Sept. 2024: Entwurfs- und Ausführungsplanung

Herbst 2024: Baubeschluss

Ende 2024: Vergabe

2025/2026: Baumaßnahme

Ende 2026: Ende Förderzeitraum (Neue Info von BBSR!)

Die aktuelle Planung

Kosten für den Abschnitt Klappergasse und Rennbahn

Haushaltsjahr	Kosten in EUR gesamt	Betrag in EUR Bundesmittel	Betrag in EUR Kommunaler Eigenanteil
2022	-	-	
2023	115.670	98.320	17.350
2024	1.098.877	934.045	164.832
2025	1.098.877	934.045	164.832
Gesamt:	2.313.424	1.966.410	347.014

Zusätzliche jährliche Kosten nach Fertigstellung

Straßenunterhaltung:	0,00 € p.a.
Grünflächen:	10.481,75 € p.a.
Unterhaltung Rinne (Regionetz):	3.500,00 € p.a.
Insgesamt:	<u>13.981,75 € p.a.</u>

Ö9: „Das grün-blaue Band – vom Verkehrsraum zum Lebensraum“

Begrünung, Bachoffenlegung und Spielpunkt in Klappergasse und Rennbahn – Planungsbeschluss

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ö10: Bericht über die Maßnahmen der Unfallkommission vom 30.03.2023

Ö11: Mitteilungen der Verwaltung

Mobilitäts- ausschuss

11.05.2023

www.aachen.de

69 von 72 in Zusammenstellung



Mobilitätsausschuss

11.05.2023

Nichtöffentlicher Teil

N1: Fraktionsinfo zur Vergabe des 3Rides Festivals, hier Einspruch der CDU-Fraktion vom 21.04.2023

N2: Mitteilungen der Verwaltung
