

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/1503/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 14.08.2020 Verfasser: Dez. III / FB 61/300															
RS 4 - Radschnellweg Euregio Sachstandsbericht hier: Antrag der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen- Richterich vom 22.06.2020																
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.09.2020</td> <td>Bezirksvertretung Aachen-Richterich</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> <tr> <td>03.09.2020</td> <td>Mobilitätsausschuss</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> <tr> <td>09.09.2020</td> <td>Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> <tr> <td>09.09.2020</td> <td>Bezirksvertretung Aachen-Mitte</td> <td>Kenntnisnahme</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	Zuständigkeit	02.09.2020	Bezirksvertretung Aachen-Richterich	Kenntnisnahme	03.09.2020	Mobilitätsausschuss	Kenntnisnahme	09.09.2020	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Kenntnisnahme	09.09.2020	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Kenntnisnahme
Datum	Gremium	Zuständigkeit														
02.09.2020	Bezirksvertretung Aachen-Richterich	Kenntnisnahme														
03.09.2020	Mobilitätsausschuss	Kenntnisnahme														
09.09.2020	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Kenntnisnahme														
09.09.2020	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Kenntnisnahme														

Beschlussvorschlag:

Der Mobilitätsausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 22.06.2020 gilt damit als gehandelt.

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Anlass:

Da der angepasste zeitliche Rahmen für die Linienfindung des Radschnellwegs Euregio (RS4) inzwischen feststeht, wollen die Projektpartner (StädteRegion Aachen, Stadt Herzogenrath und Stadt Aachen sowie Landesbetrieb Straßen NRW) ihre politischen Gremien über die weitere Vorgehensweise informieren.

Darüber hinaus hat die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen am 22.06.2020 folgenden Antrag zur Tagesordnung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich am 02.09.2020 gestellt: „Weitere Planung des Radschnellwegs Euregio – Bereich Richterich“ (vgl. Anlage 1).

Die Verwaltung wird aufgefordert, über die möglichen Lösungen der Konflikte im Bereich der Roermonder Straße in der Ortslage Richterich zu berichten.

Sachstand

Allgemein

Die Planungsvereinbarung zwischen den Projektpartnern Stadt Aachen, Stadt Herzogenrath, StädteRegion Aachen und dem Landesbetrieb Straßen NRW wurde im Juni 2019 unterzeichnet. Die Partner stimmen in einer Projektgruppe monatlich alle weiteren Planungsschritte ab. Die Projektgruppe betreut unter der Federführung der StädteRegion Aachen im Auftrag des Landes die weiteren Planungen für die Abschnitte des RS4 in der Baulast des Landes NRW. Hierzu gehören die Abschnitte außerhalb der Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet Aachen sowie alle Abschnitte im Stadtgebiet Herzogenrath. Die Stadt Aachen führt die Planung für die Abschnitte in ihrer Baulast eigenständig durch.

Über dieses Vorgehen wurde zuletzt im September 2019 informiert (vgl.

<http://ratsinfo.aachen.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=20418>).

Linienfindung

Vergleichbar wie beim Neubau einer Landesstraße wird für den RS4 zunächst ein Linienfindungsverfahren durchgeführt. Dieses Verfahren wird gemeinsam für den gesamten RS4 durchgeführt. Den Abschluss bildet die Festlegung der weiter zu planenden Linie durch das Verkehrsministerium des Landes.

Für das Linienfindungsverfahren sind Unterlagen nach den Vorgaben des Planungsleitfadens Linienbestimmung des Landesbetriebs Straßenbau zu erstellen. Die im Juni 2017 vorgelegte Machbarkeitsstudie und die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) fließen in diese Unterlagen ein. Sie sind jedoch nicht ausreichend, um die gesetzlichen Vorgaben für die Linienfindung zu erfüllen. Daher wurden nach Abstimmung mit dem Land im Januar bzw. November 2019 entsprechende Nachträge an das Ingenieurbüro für die Objektplanung Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke sowie an das Büro für die UVS beauftragt.

Im Anschluss führte der Landesbetrieb Straßen NRW eine weitere Prüfung erforderlicher Anpassungen durch, die sich aus der geänderten Rechtslage anlässlich der 2017 erfolgten Novellierung des Gesetzes für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) sowie aus internen

Richtlinien des Landesbetriebs Straßen NRW zur stufenweisen Vorgehensweise bei der UVS ergeben haben. Die Unterlagen der Linienfindung sowie die überarbeitete Fassung der UVS wurden im Januar 2020 mit den Unteren Naturschutzbehörden der Stadt Aachen und der StädteRegion sowie der Oberen Naturschutzbehörde besprochen. Im Ergebnis ist u.a. für die UVS ein zusätzlicher Umweltbericht nach UVPG zu erstellen. Mögliche Eingriffe in die Schutzgüter durch Baustraßen und Aufstellflächen für Baukräne sind bereits in diesem Planungsstadium zu bewerten und die anerkannten Naturschutzverbände sollen in einer zweiten frühzeitigen Beteiligung bereits vor dem Start der Linienfindung angehört werden. Die Unterlagen der Linienfindung sind dementsprechend anzupassen.

Nach dem jetzigen Zeitplan sollen die Unterlagen der Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke für die Linienfindung bis voraussichtlich Ende August 2020 fertiggestellt und zur abschließenden Prüfung und Freigabe an den Betriebssitz Gelsenkirchen des Landesbetriebs Straßen NRW gesandt werden. Die Überarbeitung der UVS wird voraussichtlich bis Ende September 2020 abgeschlossen. Anschließend erfolgt eine weitere frühzeitige Beteiligung der Naturschutzverbände, so dass die abschließend bearbeiteten Unterlagen der Linienfindung und der UVS voraussichtlich Anfang 2021 vorliegen. Hiermit wird dann das offizielle Linienfindungsverfahren durch den Landesbetrieb Straßen NRW eröffnet. Mit einem Abschluss des Verfahrens und der endgültigen Festsetzung der Linie des RS 4 durch das Verkehrsministerium wird nach jetzigem Stand im Sommer 2021 gerechnet.

Zeitplan für die weiteren Planungsphasen und Umsetzung

Baulast des Landes

Aufbauend auf die Vorplanung aus der Phase der Linienfindung werden durch die Projektgruppe abschnittsweise die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Abschnitte in Baulast des Landes erarbeitet. In einigen Abschnitten wird zur Erlangung des Baurechts dann ein Planfeststellungsverfahren erforderlich werden. Mit Vorliegen des Baurechts erfolgen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bau der jeweiligen Bauabschnitte. Auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse wurde für die einzelnen Abschnitte in Baulast des Landes eine grobe Zeitplanung durch die Projektgruppe erstellt, die in Anlage 2 dargestellt ist. Die Planungen sollen in mehreren Teilabschnitten (vgl. Anlage 3) parallel erfolgen, um möglichst zeitnah erste längere Strecken des RS4 in Betrieb nehmen zu können.

Gemäß der Zeitplanung könnte die Inbetriebnahme des ersten Abschnitts des RS4 in der Ortslage Kohlscheid Ende 2023 erfolgen. Die Fertigstellung aller Abschnitte in Baulast des Landes könnte etwa 2030 liegen.

Baulast Stadt Aachen

Die Stadt Aachen hat für die Planung der in ihrer Baulast liegenden Abschnitte des RS4 2019 einen Förderantrag gestellt. Im März 2020 wurden die Mittel mit dem Zuwendungsbescheid bewilligt. Aufgrund der nicht abgeschlossenen Linienfindung können derzeit lediglich vorbereitende Maßnahmen (z.B. Vermessungsarbeiten) vorgenommen werden. Sobald die Linienfindung abgeschlossen ist, wird die Stadt Aachen die weiteren Planungen aufnehmen. Die Arbeiten werden in enger Abstimmung mit den Projektpartnern vorgenommen.

Antrag der SPD-Bezirksfraktion in Richterich vom 22.06.2020

Die politischen Gremien der Stadt Aachen (Bezirksvertretungen Aachen-Mitte, Aachen Laurensberg und Aachen-Richterich sowie der Mobilitätsausschuss) hatten im Juni 2017 die Streckenführung für das Aachener Stadtgebiet und die Fortführung der Planungen des RS4 auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie und der darin ausgearbeiteten Linienführung beschlossen. Dazu gehört auch die Führung des RS4 über die Roermonder Straße in der Ortslage Richterich.

Wie bereits beschrieben läuft derzeit noch das Verfahren zur Linienfindung. Im Rahmen dieses Verfahrens werden die unterschiedlichen Varianten zur Linie des RS4, die bereits im Rahmen der Machbarkeitsstudie 2016/17 abgearbeitet wurden, noch einmal abschließend geprüft. Als Ergebnis wird dann die Linie durch das Land festgestellt.

Ein Bericht über mögliche Lösungen der in der Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich am 28.06.2017 befürchteten Konflikte kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gegeben werden, da aufgrund der o.a. Verzögerungen bei der Linienfindung die dafür notwendigen, vertiefenden Planungen noch nicht erstellt wurden. Sobald die weiteren vertiefenden Planungsstufen erarbeitet werden, wird die Verwaltung die Ergebnisse in den politischen Gremien vorstellen. Dabei werden natürlich auch – wie bereits in der Sitzung am 28.06.2017 angekündigt – die Prüfaufträge aus der Bezirksvertretung Aachen-Richterich bearbeitet und Lösungen für die möglichen Konflikte präsentiert.

Der Antrag gilt damit als behandelt.

Finanzielle Auswirkungen


Keine

Anlage/n:

Anlage 1 – Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 22.06.2020

Anlage 2 – Zeitplanung RS4 in der Baulast des Landes

Anlage 3 – RS4 Abschnittseinteilung



Kyfd. Nr. 128



Horst Werner, Schönauer Bach 17, 52072 Aachen

An die Bezirksbürgermeisterin
des Stadtbezirks Aachen - Richterich
Frau Marlis Köhne
Roermonder Str. 559
52072 Aachen

SPD-Fraktion in der
Bezirksvertretung Richterich
Horst Werner -Fraktionssprecher-
Schönauer Bach 17
52072 Aachen
E-Mail: horstwerner@alice.de

Bezirksamtsleiterin Frau Moritz
zur Kenntnis

Aachen, den 22. Juni 2020

Radschnellweg Euregio, Bereich Richterich

Sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin,

die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Aachen-Richterich beantragt gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 GeschO für Rat und Bezirksvertretungen einen Sachstandsbericht zum Thema „Weitere Planung des Radschnellwegs Euregio – Bereich Richterich“ zur Sitzung der Bezirksvertretung am 02.09.2020.


Begründung:

Am 28.06.2017 wurden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Euregio in der Bezirksvertretung Richterich vorgestellt. Während der Sitzung wurde deutlich Kritik an der Linienführung entlang der Roermonder Straße in Richterich geübt. Im Protokoll wurde festgehalten: „Die vorgestellte Planung für den Streckenabschnitt Roermonder Straße birgt Konflikte (Zufahrten zu Wohn- und Geschäftshäusern, nicht ausreichende Fahrbahnbreite für LKW-Begegnungsverkehr, Wegfall von Parkplätzen bei gleichzeitig steigendem Bedarf, keine integrale Planung mit dem Schienenhaltepunkt). Die Verwaltung wird beauftragt, Lösungen für diesen Streckenabschnitt zu erarbeiten, die die o.g. Kritikpunkte berücksichtigen.“ Bisher erfolgte kein Bericht über mögliche Lösungen der Konflikte. Da das mit den Planungen beauftragte Ingenieurbüro bis zu der Planung des Radschnellwegs keine Erfahrung mit solchen Projekten hatte, ist zu befürchten, dass Alternativen zur Streckenführung nicht erkannt und damit erst gar nicht weiter verfolgt wurden und es kein Konzept zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gibt.

Mit freundlichem Gruß
für die SPD-Bezirksfraktion

Horst Werner - Fraktionssprecher

Radschnellweg EUREGIO RS4 - Zeitplanung Abschnitte				23.07.2020	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW	KW						
Projektbeginn / Beginn Zeitleiste				01.01.2020	1	27	1	27	1	27	1	26	1	27	1	27	1	27	1	27	1	27	1	27	1	27	1					
Markierung bei Datum				01.01.2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030	2031					
Intervall Zeitleiste				6	Monat(e)																											
Aufgabe	Dauer	Beginn	Ende	01.01.2020	01.07.2020	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2022	01.07.2022	01.01.2023	01.07.2023	01.01.2024	01.07.2024	01.01.2025	01.07.2025	01.01.2026	01.07.2026	01.01.2027	01.07.2027	01.01.2028	01.07.2028	01.01.2029	01.07.2029	01.01.2030	01.07.2030	01.01.2031						
Baulast Straßen.NRW Baulast Stadt Aachen																																
Abschluss UVS und Linienfindungsverfahren			30.06.2021																													
Abschnitt 1: Templergraben bis Nizzaallee ~1.370m		Stadt Aachen																														
Abschnitt 2: Nizzaallee bis Tittardsfeld ~ 1.550m	78	Monat(e)	01.06.2020	31.10.2026																												
Schaffung Planungs- und Baurecht (inkl. Bürgerbeteiligung, Befreiung usw.) + Entwurfsplanung	25	Monat(e)	01.06.2020	30.06.2022																												
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Umsetzung Baumaßnahme	56	Monat(e)	01.04.2022	31.10.2026																												
Abschnitt 3: Tittardsfeld ~130m		Stadt Aachen																														
Abschnitt 4: Kurve Tittardsfeld bis Horbacher Straße ~770m	80	Monat(e)	01.06.2020	31.12.2026																												
Schaffung Planungs- und Baurecht (inkl. Bürgerbeteiligung, Befreiung usw.) + Entwurfsplanung	47	Monat(e)	01.06.2020	31.03.2024																												
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Umsetzung Baumaßnahme	33	Monat(e)	01.04.2024	31.12.2026																												
Abschnitt 5: Horbacher Straße bis Richtericher Dell ~1.600		Stadt Aachen																														
Abschnitt 6: Nördl. Ortsausgang Richterich bis Kircheichstraße ~1.660	68	Monat(e)	01.06.2020	31.12.2025																												
Schaffung Planungs- und Baurecht (inkl. Bürgerbeteiligung, Befreiung usw.) + Entwurfsplanung	44	Monat(e)	01.06.2020	31.12.2023																												
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Umsetzung Baumaßnahme	24	Monat(e)	01.01.2024	31.12.2025																												
Abschnitt 7: Kircheichstraße bis Mühlenstraße ~1.870	45	Monat(e)	01.06.2020	31.01.2024																												
Schaffung Planungs- und Baurecht (inkl. Bürgerbeteiligung, Befreiung usw.) + Entwurfsplanung	31	Monat(e)	01.06.2020	31.12.2022																												
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Umsetzung Baumaßnahme	18	Monat(e)	01.08.2022	31.01.2024																												
Abschnitt 8: Mühlenstraße bis Nieuwstraat, Abzweig Kerkrade ~600m	61	Monat(e)	01.01.2021	31.12.2025																												
Schaffung Planungs- und Baurecht (inkl. Bürgerbeteiligung, Befreiung usw.) + Entwurfsplanung	38	Monat(e)	01.01.2021	29.02.2024																												
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Umsetzung Baumaßnahme	22	Monat(e)	01.03.2024	31.12.2025																												
Abschnitte 9 und 10: Mühlenstraße bis Bicherouxstraße ~4.500m	128	Monat(e)	01.06.2020	30.11.2030																												
Schaffung Planungs- und Baurecht (inkl. Bürgerbeteiligung, Befreiung usw.) + Entwurfsplanung	62	Monat(e)	01.06.2020	30.06.2025																												
Ausführungsplanung, Ausschreibung, Umsetzung Baumaßnahme	66	Monat(e)	01.07.2025	30.11.2030																												
Abschnitt 11: Bicherouxstraße bis Gewerbegebiet Bicherouxstraße		spätere Umsetzung																														
Abschnitt 12: Roermonder Straße bis nördlicher Ortsausgang Alt-Richterich		Radvorrangroute, Stadt Aachen																														
Abschnitt 13: nördl. Orsausgang Richterich bis süd. Ortseingang Horbach		Radvorrangroute																														
Abschnitt 14: Ortsdurchfahrt Horbach		Radvorrangroute, Stadt Aachen																														
Abschnitt 15: Ortsausgang Horbach bis Grenze Loch		Radvorrangroute																														

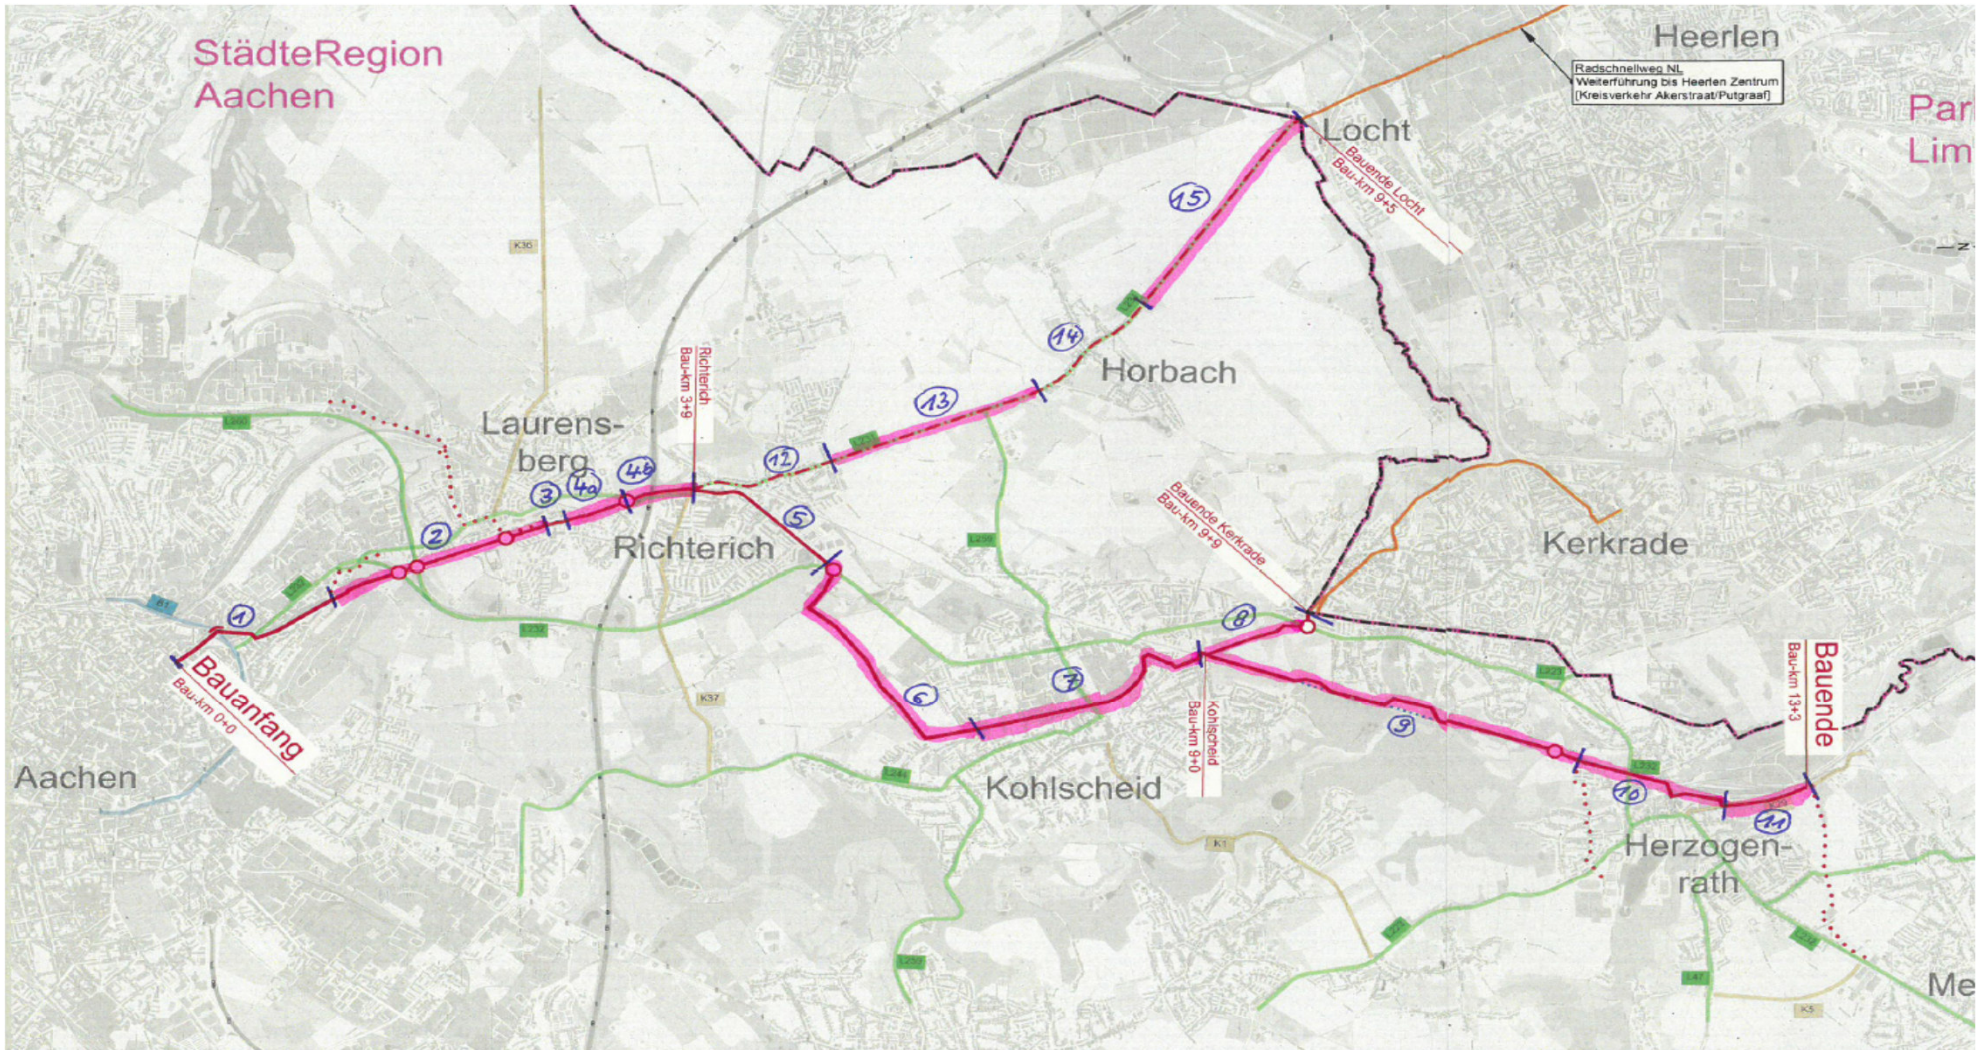

Radschnellweg Euregio (RS 4) - Abschnittseinteilung
